Утверждаю:
Директор СП ПЦЭС филиала
АО «ДРСК» - «ПЭС»
_____ /М.П. Морозов/
«____» июля 2021г.

Начальнику СПРиТП Ткачеву А.Е.
от и.о. начальника Октябрьского района электрических сетей Бурмистрова Н.С.

Дата 12.07.2021 г. (*поручения о подготовке акта обследования*)

Дата 22.07.2021 (*направления заполненного акта обследования*)

Акт обследования № 01-122-10-546

Регистрационный номер ДОУ ТПр 4058/21 дата регистрации ДОУ 12.07.2021

1. Заявитель: Федеральное государственное казенное учреждение "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" Владивостокский филиал телефон: _____

2. Наименование объекта: КТП-СЭЩ-К-250/10/0,4 кВ "ИДК ЖДПП Пограничный"

Фактический объект: _____

3. Адрес объекта: Приморский край, в районе железнодорожной станции Гродеково - I на 99 км ПК9, кадастровый номер земельного участка 25:14:040101:365

4. Заявленная мощность (кВт): 200

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 10 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-**Пограничная,** №ф. 6(10) кВ **« 4 »,** «Богуславка» ВЛ-10кВ № опоры **70** от проектируемой ВЛ-10кВ.

Предполагаемая точка БПиЭО_____

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: _100 метров.


9.1. Информация о наличии электрических сетей прочих собственников (не ССО) на расстоянии меньшим, чем указано в п.9 настоящего акта:


10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:


№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения		Тип, параметры	Количество
1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ				
1.1.	Длина ЛЭП по трассе (м)		ВЛ	**115**
			КЛ	
1.2.	Установка опор (шт.)	ж/б	одностоечная	1
		деревянные	одностоечная с 1 укосом	3
		на ж/б приставке	одностоечная с 2 укосами	
			1 укос	1
1.3.	Подвеска провода по трассе, в три провода (м)			120
1.4.	Установка разъединителей (1 компл.)		РЛНДз-10/400	1
1.7.	Установка разрядников (ОПН) (шт.)		ОПН-10	3
4. Установка дополнительного оборудования				
4.1.	Марка счетчика ЭЭ с учетом информации указанной		ПКУ-10кв ТТ-30/5	1
	Вырубка ОСД		Мелколесье шт.	20

12. Примечания: Выполнить строительство ВЛ-10кВ от опоры №70 ВЛ-10кв ПС 35/10 «Пограничная».

13. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):



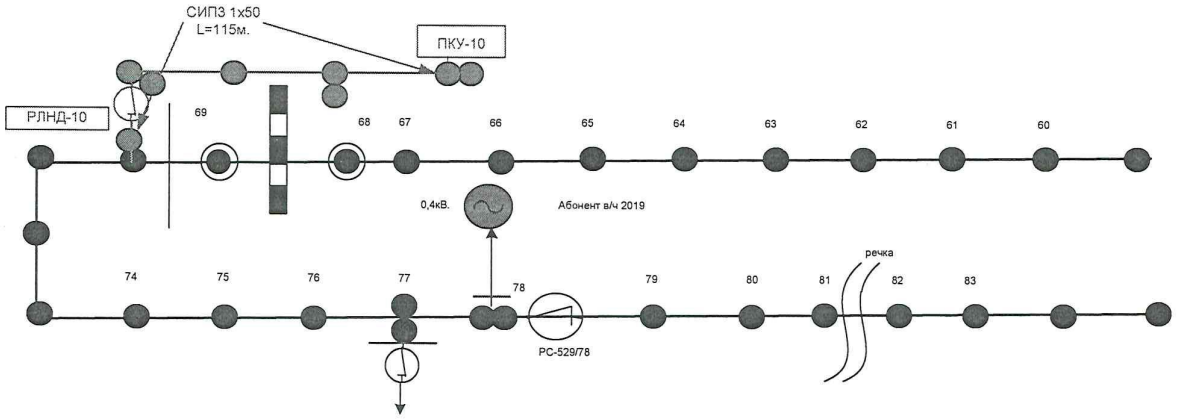

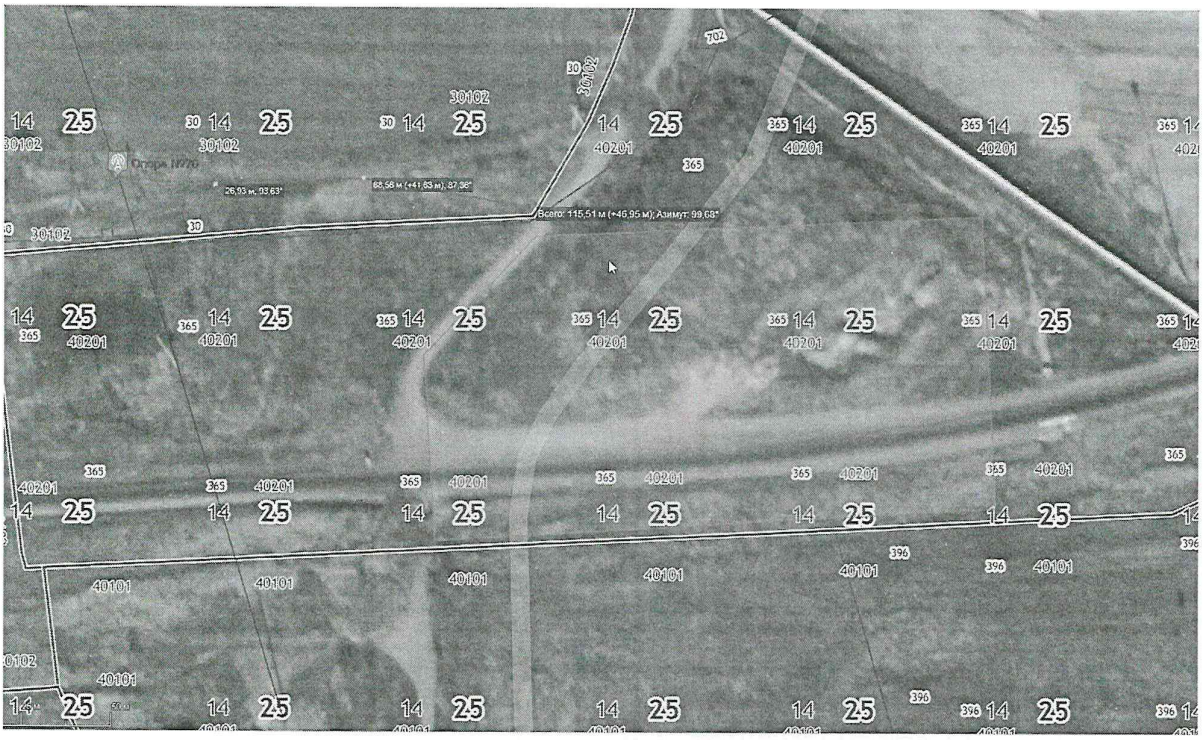

И.о. начальника Октябрьского РЭС — Должность

Подпись

Бурмистров Н.С. — ФИО

«_22__» _июля__2020 г.
