Дата 09.02.2018 г. (*поручения о подготовке акта обследования*)

Дата _____ (*направления заполненного акта обследования*)

**Акт обследования № _____**

Регистрационный номер ДОУ ТПр 596/18 дата регистрации ДОУ 12.02.2018

**1. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Сучан-Уголь" телефон: 89240038812, 84236366685**

**2. Наименование объекта: шахта "Центральная" со строительством ПС 35/6 кВ**

**Фактический объект: _____**

**3. Адрес объекта: Приморский край, г. Партизанск, ул. Бункерная, д. 7, кадастровый номер земельного участка 25:33:180111:2795**

**4. Заявленная мощность (кВт): 9 800**

**5. Заявленный класс напряжения (кВ): 35 кВ**

**6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3, 1.**

**7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0**

**8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:**

Первая точка присоединения: «ПаГРЭС-Партизан № 1»

№ опоры 8.

Вторая точка присоединения: «ПаГРЭС-Партизан № 2»

№ опоры 8.

Предполагаемая точка БПиЭО _____

**9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 400 метров.**

9.1. Информация о наличии электрических сетей прочих собственников (не ССО) на расстоянии меньшим, чем указано в п.9 настоящего акта:

Наименование собственника _____;


Класс напряжения (кВ) _____;

Расстояние (м)_____.

**10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:**

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Тип, параметры | Количество |
|---|---|---|---|
| | ***1. Реконструкция ЛЭП 35 кВ*** | | |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) | ВЛ (две цепи) | 1300 |
| 1.2. | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) | АС-240 | 7800 |
| 1.3. | Установка ВЧ-заградителей | | |
| | **2. Демонтажные работы** | | |
| 2.1. | Демонтаж проводов ВЛ 35кВ (пролетов) | | 8 |
| | **3. Работы на ПС 35-110 кВ** | | |
| 3.1. | Замена ТТ 35 кВ (2 ЛЭП 35 кВ +Секционный) | 600/5 | 9 |
| | | | |

**11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):**

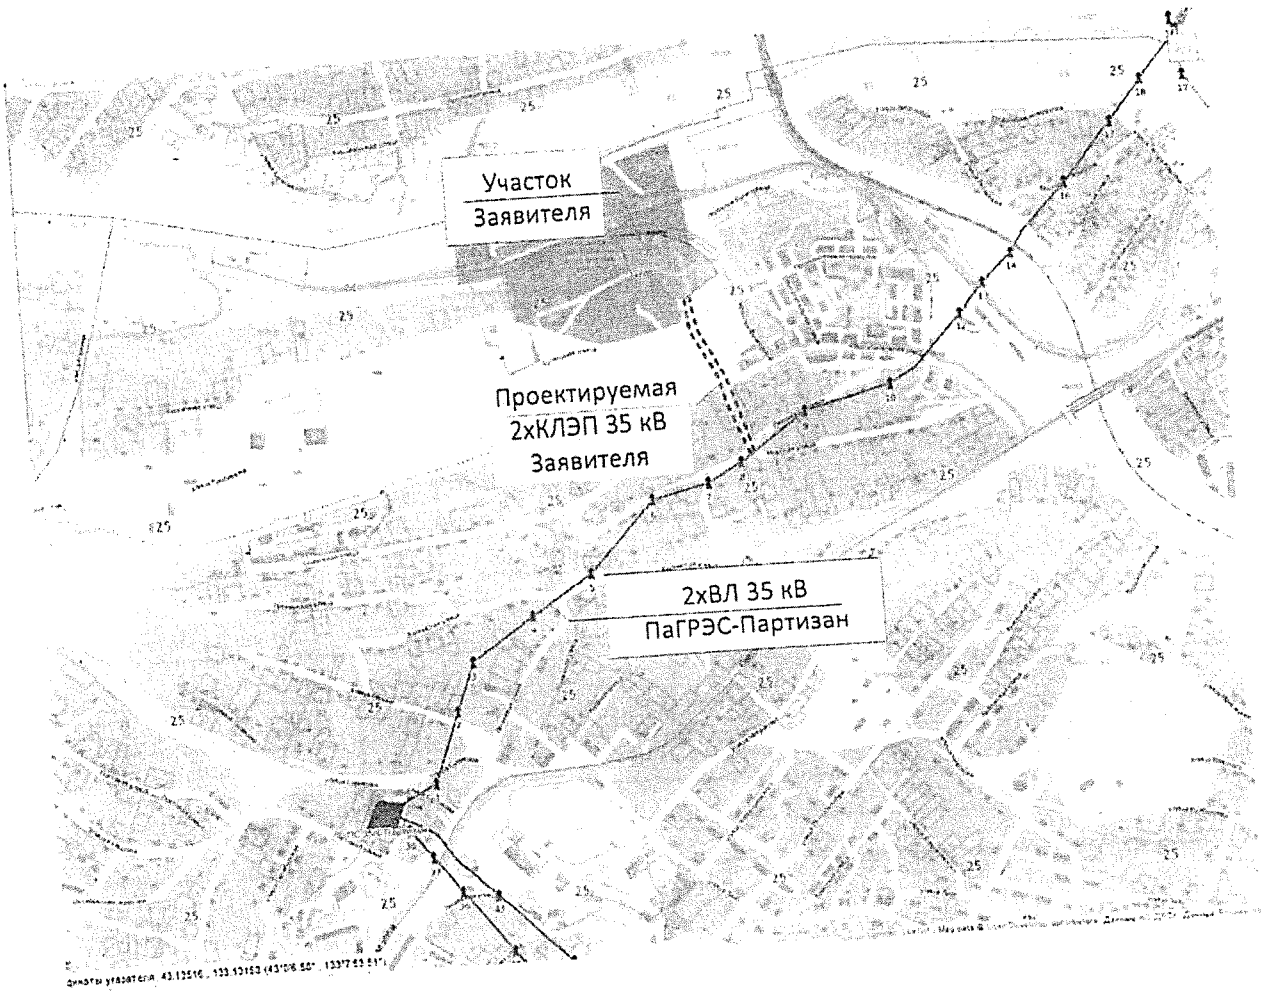


**12. Примечания:**

Необходимо:

1. Реконструкция ЛЭП 35 кВ «Партизан-Горная-Северная-Авангард № 1, 2» с заменой провода АС-95 мм на АС-240 мм до опоры № 8.
2. Реконструкция РУ 35 кВ ПС Партизан с заменой ТТ 300/5 на 600/5 на отходящих ЛЭП 35 кВ «Партизан Горная Северная Авангард №1,2» и СВ 35 кВ.
