Начальнику СТП
Е.Н. Сироткину
От начальника Благовещенского РЭС
Орёл Н.Г.

Дата поручения о подготовке акта обследования: 13.06.2019
Дата направления заполненного акта обследования: 13.06.2019

Акт обследования

1. Заявитель: Николаенко Валерия Валерьевна телефон: 89622859366
2. Наименование объекта: садовый дом
3. Адрес объекта: Амурская область, Благовещенский район, 10 км Игнатьевского шоссе
Кадастровый или условный № 28:10:130246:95
4. Заявленная мощность (кВт): 15
5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4
6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.
7. Ранее присоединённая мощность, категория надёжности и уровень напряжения:
Новое строительство
8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:
Первая точка присоединения: ПС – Дачная, № ф. 6(10) кВ «4», ТП № проектируемая
№ ф. 0,4 кВ__,№ опоры

Вторая точка присоединения: ПС-_____, №ф. 6(10) кВ «__», ТП № _____,
№ ф. 0,4 кВ, _____ . № опоры _____.


9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 570 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения			Тип, параметры	Количество
	1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ				
1.1.	Длина ЛЭП по трассе (м)			ВЛ	1800
				КЛ	
	2. Реконструкция ЛЭП 6(10) кВ				
	Длина ЛЭП по трассе (м)			ВЛ	
				КЛ	
1.2.	Установка опор (шт.)		ж/б	одностоечная	
			деревянные	одностоечная с 1 укосом	
			на ж/б приставке	одностоечная с 2 укосами	
				1 укос	1
1.3.	Подвеска провода, в три провода (м)				
1.4.	Установка разъединителей (1 компл.)				
1.5.	Установка реклоузера (1 компл.)				
1.6.	Муфта для КЛ (шт.)				
1.7.	Установка разрядников (шт.)				
	3. Строительство ЛЭП 0,4 кВ				
2.1.	Длина ЛЭП, по трассе (м)			ВЛ	120
				КЛ	
2.2.	Установка опор (шт.)	X	ж/б	одностоечная	
			деревянные	одностоечная с 1 укосом	
			на ж/б приставке	одностоечная с 2 укосами	
				1 укос	
2.3.	Подвеска провода, по длине ВЛ (м)	кол. Проводов ВЛ		Марка провода	
			2 провода		
		X	4 провода		125
2.4.	Муфта для КЛ (шт.)				
2.5.	Устройство ответвления к зданию (шт.)			в 2 провода	
				в 4 провода	

4. Установка ТП				
3.1.	Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП)			
3.2.	Установка ТП 10/0,4 кВ			1
5. Установка дополнительного оборудования				
4.1.	Установка разъединителя (шт.)			
4.2.	Установка коммутационного аппарата в ТП (шт.)			
6. Демонтажные работы				
5.1.	Демонтаж опор ВЛ 10 кВ (шт.)		ж/б	одностоечная
				одностоечная с 1 укосом
			деревянные	одностоечная с 2 укосами
			на ж/б приставке	1 укос
5.2.	Демонтаж опор ВЛ 0,38 кВ (шт.)		ж/б	одностоечная
				одностоечная с 1 укосом
			деревянные	одностоечная с 2 укосами
			на ж/б приставке	1 укос
5.3.	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ (пролетов)			
5.4.	Демонтаж проводов ВЛ 6(10) кВ (пролетов)			
5.5.	Демонтаж ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП)			
5.6.	Демонтаж силового трансформатора в ТП			
5.7.	Демонтаж коммутационного аппарата в ТП (шт.)			
5.8.	Демонтаж ответвления к зданию (шт.)			в 2 провода
				в 4 провода
7. Работы на ПС 35-110 кВ				

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

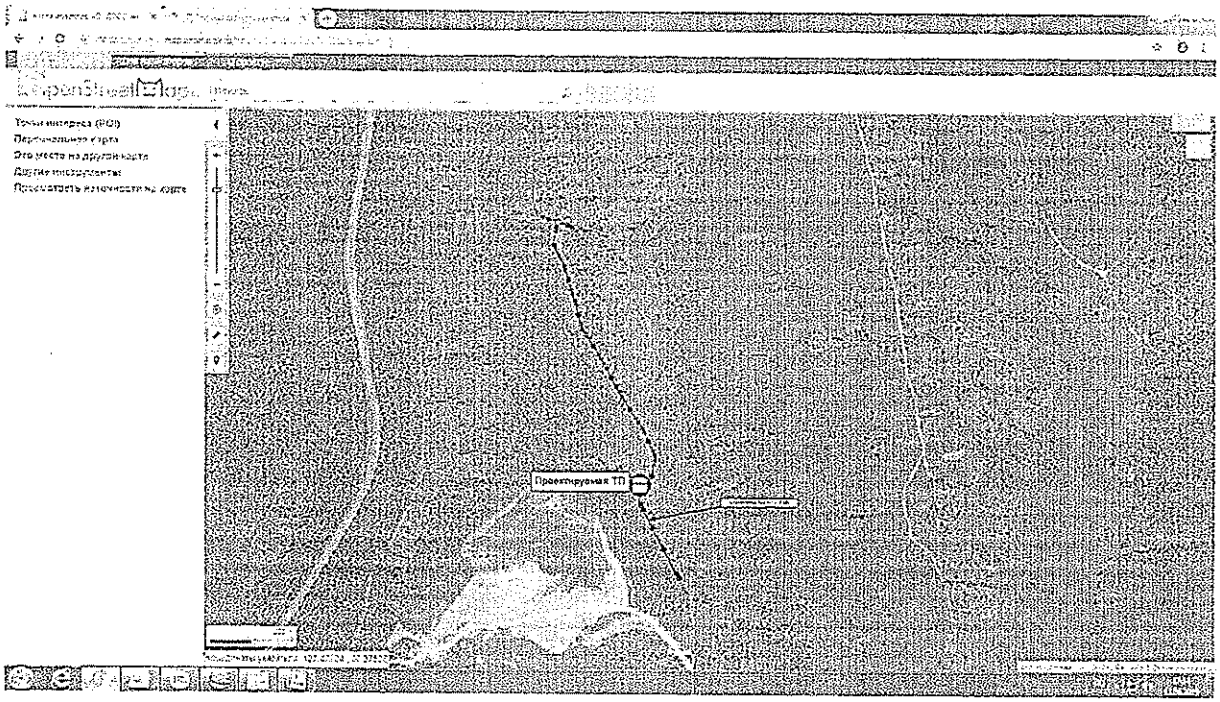

12. Примечания: необходимо выполнить проект электроснабжения: строительство ВЛ 10-0,4 кВ с установкой ТП 10/0,4кВ. Трассу прохождения ВЛ 10-0,4 кВ, марку провода, тип и мощность ТП определить проектом. Точкой подключения проектируемой ВЛ 10 кВ принять проектируемый Ф-10 кВ № 4 ПС «Дачная». Электроснабжение садового дома выполнить от проектируемой ВЛИ-0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ.

Начальник БРЭС — Должность
Подпись
Орёл Н.Г. — ФИО
«13» июня 2019 г.
