ОПРОСНЫЙ ЛИСТ-ЗАЯВКА
на поставку выключателей трёхполюсных элегазовых серии ВГБ-35

1. Количество заказываемых выключателей, шт. | 2 |
2. Исполнение выключателя по номинальному току Iном., А не менее | 630 |
3. Номинальный ток отключения, не менее 12,5 кА
4. Исполнение выключателя по типу привода *(нужное отметить)*

Тип привода	Наименование параметра	Требуемые параметры	
		Стандартная поставка	По заказу
Привод ПЭМ-2 ☒	Номинальное напряжение переменного тока цепей питания электромагнита включения, В	~ 220 ☒	—
	Номинальное напряжение постоянного тока цепей питания электромагнита отключения и контактора, В	= 220 ☒	—

5. Исполнение в зависимости от расстояния между приводом и выключателем *(нужное отметить)*

исполнение	размер Б, мм	размер В, мм	размер С, мм
стандартное ☒	850	2540	260

6. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ1 (+40 °С ÷ -60 °С) | ☒ |

7. Исполнение по токовому выводу | стандартное (вариант 1) | ☒ |

8. Исполнение выключателя по типу трансформаторного тока *(нужное отметить)*

стандартное исполнение со вторичным током 5 А	☒


Трансформатор тока	I1ном./ I2ном., А	Класс точности/ нагрузка, ВА	Кбез. или Ккрат.	I1ном./ I2ном., А	Класс точности/ нагрузка, ВА	Кбез. или Ккрат.	I1ном./ I2ном., А	Класс точности/ нагрузка, ВА	Кбез. или Ккрат.	I1ном./ I2ном., А	Класс точности/ нагрузка, ВА	Кбез. или Ккрат.
ТА1	**300/5**	0,5/30	5	**200/5**	0,5/20	5	**150/5**	0,5/10	5	**100/5**	0,5/10	5
ТА2	**300/5**	0,5S/20	5	**200/5**	0,5S/7,5	5	**150/5**	0,5/5	5	**100/5**	0,5/3	5
ТА3	**300/5**	10Р/30	10	**200/5**	10Р/30	7	**150/5**	10Р/30	5	**100/5**	10Р/30	3
ТА4	**300/5**	10Р/30	10	**200/5**	10Р/30	7	**150/5**	10Р/30	5	**100/5**	10Р/30	3

9. Дополнительные требования заказчика


8.1. Герметизировать выход кабелей токовых цепей из клеммных коробок трансформаторов тока.

8.2. Исполнение изоляции вводов – фарфор.

8.3. Укомплектовать привод ПЭМ-2 дополнительными КСА (6Н.3+6Н.О).

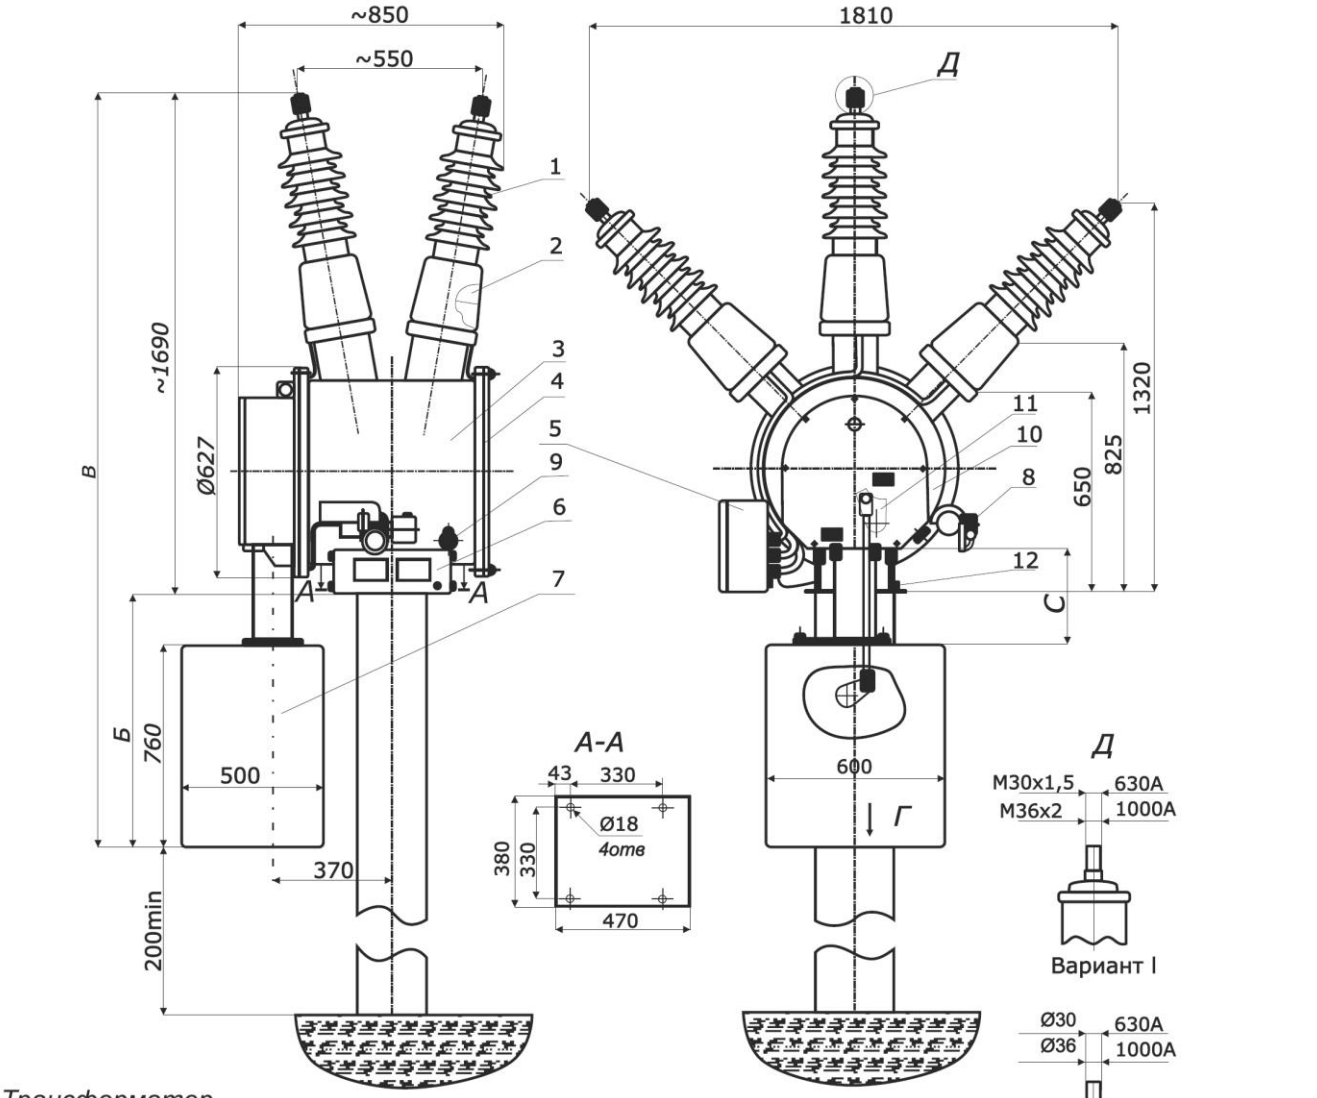


Трансформатор



На каждом вводе установлены конструктивно одинаковые трансформаторы тока

Г

Привязка отверстий под кабельные вводы



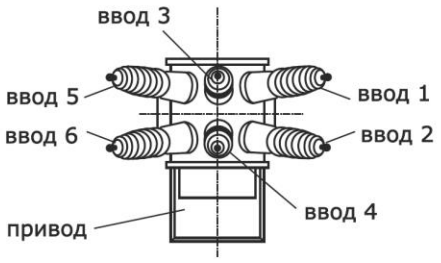


Схема расположения вводов

1- ввод; 2- трансформатор тока; 3- бак; 4- фланец; 5- шкаф (в днище имеются 7 отв Ø 25,6 и 1 отв Ø20,8 для установки кабельных вводов); 6- устройство подогревательное; 7- шкаф с приводом; 8- сигнализатор плотности; 9- клапан; 10- крышка; 11- механизм; 12- болт заземления.

Значения размеров Б, В и С указаны в табл.3 "Опросного листа"
