
№ пп	Наименование работ и затрат, единица		Тип, параметры	Колич
4. Установка дополнительного оборудования				
4.1.	Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.)			1
5. Демонтажные работы				
5.1.	Демонтаж опор ВЛ 10 кВ (шт.)	ж/б	одностоечная	
			одностоечная с 1 укосом	
		деревянные	одностоечная с 2 укосами	
		на ж/б приставке	1 укос	
5.2.	Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ (шт.)	ж/б	одностоечная	
			одностоечная с 1 укосом	
		деревянные	одностоечная с 2 укосами	
		на ж/б приставке	1 укос	
5.3.	Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ (пролетов)			1
5.4.	Демонтаж проводов ВЛ 6(10) кВ (пролетов)			
5.5.	Демонтаж ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП)			
5.6.	Демонтаж силового трансформатора в ТП			**1**
5.7.	Демонтаж коммутационного аппарата в ТП (шт.)			1
5.8.	Демонтаж ответвления к зданию (шт.)		в 2 провода	
			в 4 провода	
6. Работы на ПС 35-110 кВ				

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

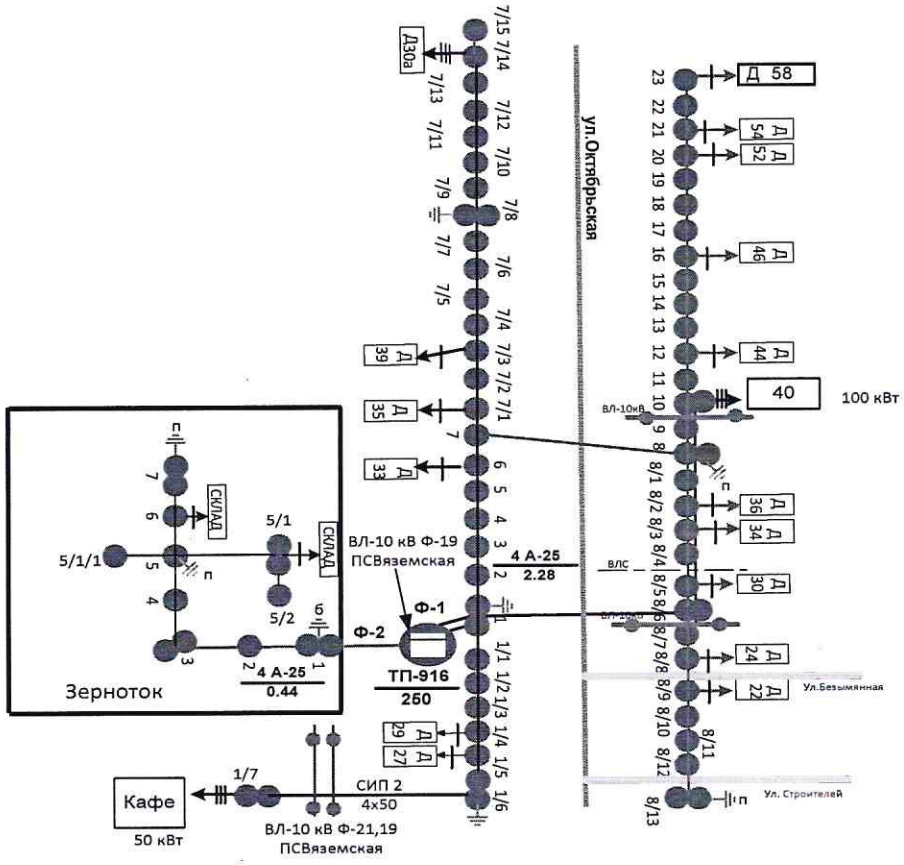

12. Примечания: Для подключения зернотока необходима замена трансформатора в ТП-916 (250 кВА) на более мощный в связи с большой нагрузкой. От ТП-916 уже питаются объекты (макс.мощн. 250 кВт), а также жилые дома. Замена неизолированного провода (АС-25) на СИП от ТП-916 (ф-2) до оп.1 (20м).

Начальник ВРЭС — Должность

Подпись

Ашуров А.С — ФИО

Начальнику СПРиТП _____

от начальника сетевого района II г. Вяземского РЭС Ашурова А.С.

Акт обследования № ТПр 1168/20

Регистрационный номер ДОУ ТПр 1168/20 дата регистрации ДОУ 01.06.2020

1. Заявитель: ООО "Агрофирма"Семена" телефон: +7 (962) 221-7717

2. Наименование объекта: Зерноток ТП-916

Фактический объект: _____

3. Адрес объекта: Хабаровский край, Вяземский р-н, с. Отрадное, ул. Октябрьская, д. 29, кадастровый номер земельного участка 27:06:0020622:50

4. Заявленная мощность (кВт): 70

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 50

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-**Вяземская**, №ф. 6(10) кВ **« 19 »**, ТП № 916, ТМ 6-10/0,4 _250_ кВА; № ф. 0,4 кВ **2**, № опоры ___1____.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: _____5____ **метров.**

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения	Тип, параметры	Количество
	1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ		
1.1.	Длина ЛЭП по трассе (м)	ВЛ	
		КЛ	
1.2.	Установка опор (шт.)	одностоечная	
		одностоечная с 1 укосом	
		одностоечная с 2 укосами	
		1 укос	
1.3.	Подвеска провода по трассе, в три провода (м)		
1.4.	Установка разъединителей (1 компл.)		
1.5.	Установка реклоузера (1 компл.)		
1.6.	Муфта для КЛ (шт.)		
1.7.	Установка разрядников (ОПН) (шт.)		
	2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ		
2.1.	Длина ЛЭП, по трассе (м)	ВЛИ	20
		КЛ	
2.2.	Установка опор (шт.)	одностоечная	
		одностоечная с 1 укосом	
		одностоечная с 2 укосами	
		1 укос	
2.3.	Подвеска провода по трассе ВЛ (м)	кол. проводов ВЛ	
		2 провода	
		4 провода	
2.4.	Муфта для КЛ (шт.)		
2.5.	Устройство ответвления к зданию (шт.)	в 2 провода	
		в 4 провода	
	3. Установка ТП		
3.1.	Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.)		
3.2.	Установка силового трансформатора в ТП		1

	ж/б
	деревянные
	на ж/б приставке

	ж/б
	деревянные
	н ж/б приставке

	2 провода
	4 провода
