Бобун Александра Андреевна

Начальнику СПРиТП Кузнецову А.Е.

От и.о.начальника сетевого района III г. Бикинского РЭС Бергена Д.Ф.

Дата 31.07.2020 г. (*поручения о подготовке акта обследования*)

Дата 03.08.2020 г. (*направления заполненного акта обследования*)

Акт обследования № ТПр 2023/20

Регистрационный номер ДОУ ТПр 2023/20 дата регистрации ДОУ 29.07.2020

1. Заявитель: Гаврилова Галина Валерьевна телефон: +7 (914) 540-8852

2. Наименование объекта: Магазин

Фактический объект: _____

3. Адрес объекта: Хабаровский край, р-н Бикинский, с. Лермонтовка, ул. Дорожная, 22 А, кадастровый номер земельного участка 27:03:0010416:312

4. Заявленная мощность (кВт): 15

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-**Лермонтовка,** №ф. 10 кВ **« 4 »,** ТП № 8007 наименование _____ ТМ 6-10/0,4 _250_ кВА; № ф. 0,4 кВ, **4** № опоры __7/4____.

Предполагаемая точка БПиЭО: зажимы на опоре № 7/4 ВЛ 0,4 кВ Ф-4 ТП-8007_____

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: __130___ метров.

9.1. Информация о наличии электрических сетей прочих собственников (не ССО) на расстоянии меньшим, чем указано в п.9 настоящего акта:

Наименование собственника ___-___; Класс напряжения (кВ) ___-____;Расстояние (м)_____.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:


№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения			Тип, параметры	Количество
1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ					
1.1.	Длина ЛЭП по трассе (м)			ВЛ	-
				КЛ	
1.2.	Установка опор (шт.)	V	ж/б	одностоечная	1
			деревянные	одностоечная с 1 укосом	1
			на ж/б приставке	одностоечная с 2 укосами	-
				1 укос	-
1.3.	Подвеска провода по трассе, в три провода (м)				--
1.4.	Установка разъединителей (1 компл.)				-
1.5.	Установка реклоузера (1 компл.)				
2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ					
2.1.	Длина ЛЭП, по трассе (м)			ВЛ	**370**
				КЛ	-
2.2.	Установка опор (шт.)		ж/б	одностоечная	2
			деревянные	одностоечная с 1 укосом	2
			н ж/б приставке	одностоечная с 2 укосами	1
				1 укос	1
2.3.	Подвеска провода по трассе ВЛ (м)	кол. проводов ВЛ			
			2 провода		
		V	4 провода		370
2.4.	Муфта для КЛ (шт.)				
2.5.	Устройство ответвления к зданию (шт.)			в 2 провода	1
				в 4 провода	2
3. Установка ТП					

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения	Тип, параметры	Количество
3.1.	Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.)		-
3.2.	Установка силового трансформатора в ТП		-
	4. Установка дополнительного оборудования		
4.1.	Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.)	АВ-80А	1
	5. Демонтажные работы		
5.1.	Демонтаж опор ВЛ 10 кВ (шт.)	V ж/б	одностоечная 1
		деревянные	одностоечная с 1 укосом
		на ж/б приставке	одностоечная с 2 укосами
			1 укос
5.2.	Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ (шт.)	ж/б	одностоечная
		деревянные	одностоечная с 1 укосом
		на ж/б приставке	одностоечная с 2 укосами
			1 укос
			в 4 провода

11. Дополнительные сведения по монтажу (заполняется при условии получения заявки на выполнение работ по технологическому присоединению «под ключ»):	
Высота приемной траверсы	
Высота трубостойки	
Марка счетчика ЭЭ с учетом информации указанной заявителем	
Уточненные данные по расстоянию от точки присоединения до планируемого места установки ВРУ 0,4 (0,22) кВ, м	

12. Примечания: Для тех.присоединения магазина необходимо строительство ВЛ-0,4 кВ.
1) Заменить опору №7 на сложную (СВ-105,3 с укосом), установить через улицу опору № 7/1 (СВ-105,3).
2) От опоры №7 построить ВЛ-0,4 кВ длиной 160 м. (провод СИП2-3*50+1*54,6)
3) Установить укос к опоре № 6
4) В связи с большой протяженностью ВЛ (более 1 км.) и недостаточным сечением провода (АС-25) требуется осуществить реконструкцию ф-3 ВЛ-0,4 кВ ТП-8007 – от РУ-0,4 кВ проложить по существующей ВЛ провод СИП-2 (3*50+1*54,6) до опоры №7 – 210м.. Заменить 1 наружный ввода на СИП 2*16 - 20м. и 1 наружный ввод на СИП 4*16-40 м. Присоединение магазина осуществить от опоры №7/4.

13. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

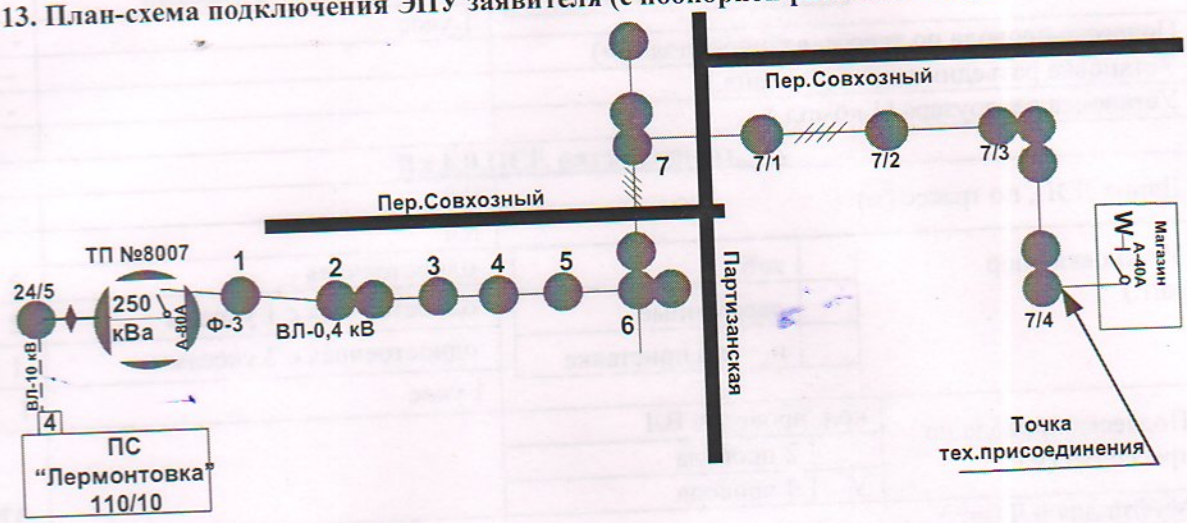

И.о.начальник БРЭС _____ _____ Берген Д.Ф.
Должность Подпись ФИО
