СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

КОМУ: НАЧАЛЬНИКУ СЛУЖБЫ СПР И ТП А.Е. КУЗНЕЦОВУ

ОТ: ОТ НАЧАЛЬНИКА СЕТЕВОГО РАЙОНА ХСРЭС КАБАЕВА П.М.

ТЕМА: ИЗМЕНЕНИЕ АКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

ДАТА: 17.08.2020 Г.

КОПИЯ:

Прошу изменить акт обследования ТПр 1283/20 от 10.06.2020. В связи с уточнением мероприятий. Новый Акт обследования прилагается.

Кабаев П.М.

Авраменко Д.М.

Начальнику СПРиТП _____

от начальника сетевого района I гр. Хабаровского Северного РЭС Кабаева П.М.

Дата 23.06.2020 г. (*поручения о подготовке акта обследования*)

Дата _____ (*направления заполненного акта обследования*)

Акт обследования № ТПр 1283/20

Регистрационный номер ДОУ ТПр 1283/20 дата регистрации ДОУ 10.06.2020

1. Заявитель: Филимонов Станислав Владимирович телефон: _____

2. Наименование объекта: жилой дом

Фактический объект: _____

3. Адрес объекта: Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Тополево, ул. Кузнечная, д. 1, кадастровый номер земельного участка 27:17:0302809:223

4. Заявленная мощность (кВт): 135

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 15

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-**Тополево**, №ф. 6(**10**) кВ **«10»**, ТП № **1682**, наименование _____ ТМ 6-10/0,4 **160** кВА; № ф. 0,4 кВ, **новый**

№ опоры **от РУ 0,4**.

Вторая точка присоединения: ПС-_____, №ф. 6(10) кВ «_____», ТП № _____,

№ ф. 0,4 кВ, _____. № опоры _____.

Предполагаемая точка БПиЭО_____

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 10 метров.

9.1. Информация о наличии электрических сетей прочих собственников (не ССО) на расстоянии меньшим, чем указано в п.9 настоящего акта:

Наименование собственника _____;

Класс напряжения (кВ) _____;

Расстояние (м)_____.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения		Тип, параметры	Количество
1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ				
1.1.	Длина ЛЭП по трассе (м)		ВЛ	
			КЛ	
1.2.	Установка опор (шт.)	ж/б	одностоечная	
		деревянные	одностоечная с 1 укосом	
		на ж/б приставке	одностоечная с 2 укосами	
			1 укос	
1.3.	Подвеска провода по трассе, в три провода (м)			
1.4.	Установка разъединителей (1 компл.)			
1.5.	Установка реклоузера (1 компл.)			
1.6.	Муфта для КЛ (шт.)			
1.7.	Установка разрядников (ОПН) (шт.)			
2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ				
2.1.	Длина ЛЭП, по трассе (м)		ВЛ	**80м**
			КЛ	
2.2.		ж/б	одностоечная	
		деревянные	одностоечная с 1 укосом	
			одностоечная с 2 укосами	

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения		Тип, параметры	Количе
	Установка опор (шт.)	н ж/б приставке	1 укос	
2.3.	Подвеска провода по трассе ВЛ (м)	кол. проводов ВЛ		
		2 провода	**СИП 4х95**	**80м**
		4 провода		
2.4.	Муфта для КЛ (шт.)			
2.5.	Устройство ответвления к зданию (шт.)		в 2 провода	
			в 4 провода	
3. Установка ТП				
3.1.	Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.)			
3.2.	Установка силового трансформатора в ТП		**250 кВА**	**1шт**
4. Установка дополнительного оборудования				
4.1.	Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.)		**РУ 0,4 кВ**	**1шт**
5. Демонтажные работы				
5.1.	Демонтаж опор ВЛ 10 кВ (шт.)	ж/б	одностоечная	
		деревянные	одностоечная с 1 укосом	
		на ж/б приставке	одностоечная с 2 укосами	
			1 укос	
5.2.	Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ (шт.)	ж/б	одностоечная	
		деревянные	одностоечная с 1 укосом	
		на ж/б приставке	одностоечная с 2 укосами	
			1 укос	
5.3.	Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ (пролетов)			
5.4.	Демонтаж проводов ВЛ 6(10) кВ (пролетов)			
5.5.	Демонтаж ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП)			
5.6.	Демонтаж силового трансформатора в ТП		**160 кВА**	**1шт**
5.7.	Демонтаж коммутационного аппарата в ТП (шт.)		**РУ 0,4 кВ**	**1шт**
5.8.	Демонтаж ответвления к зданию (шт.)		в 2 провода	
			в 4 провода	
6. Работы на ПС 35-110 кВ				

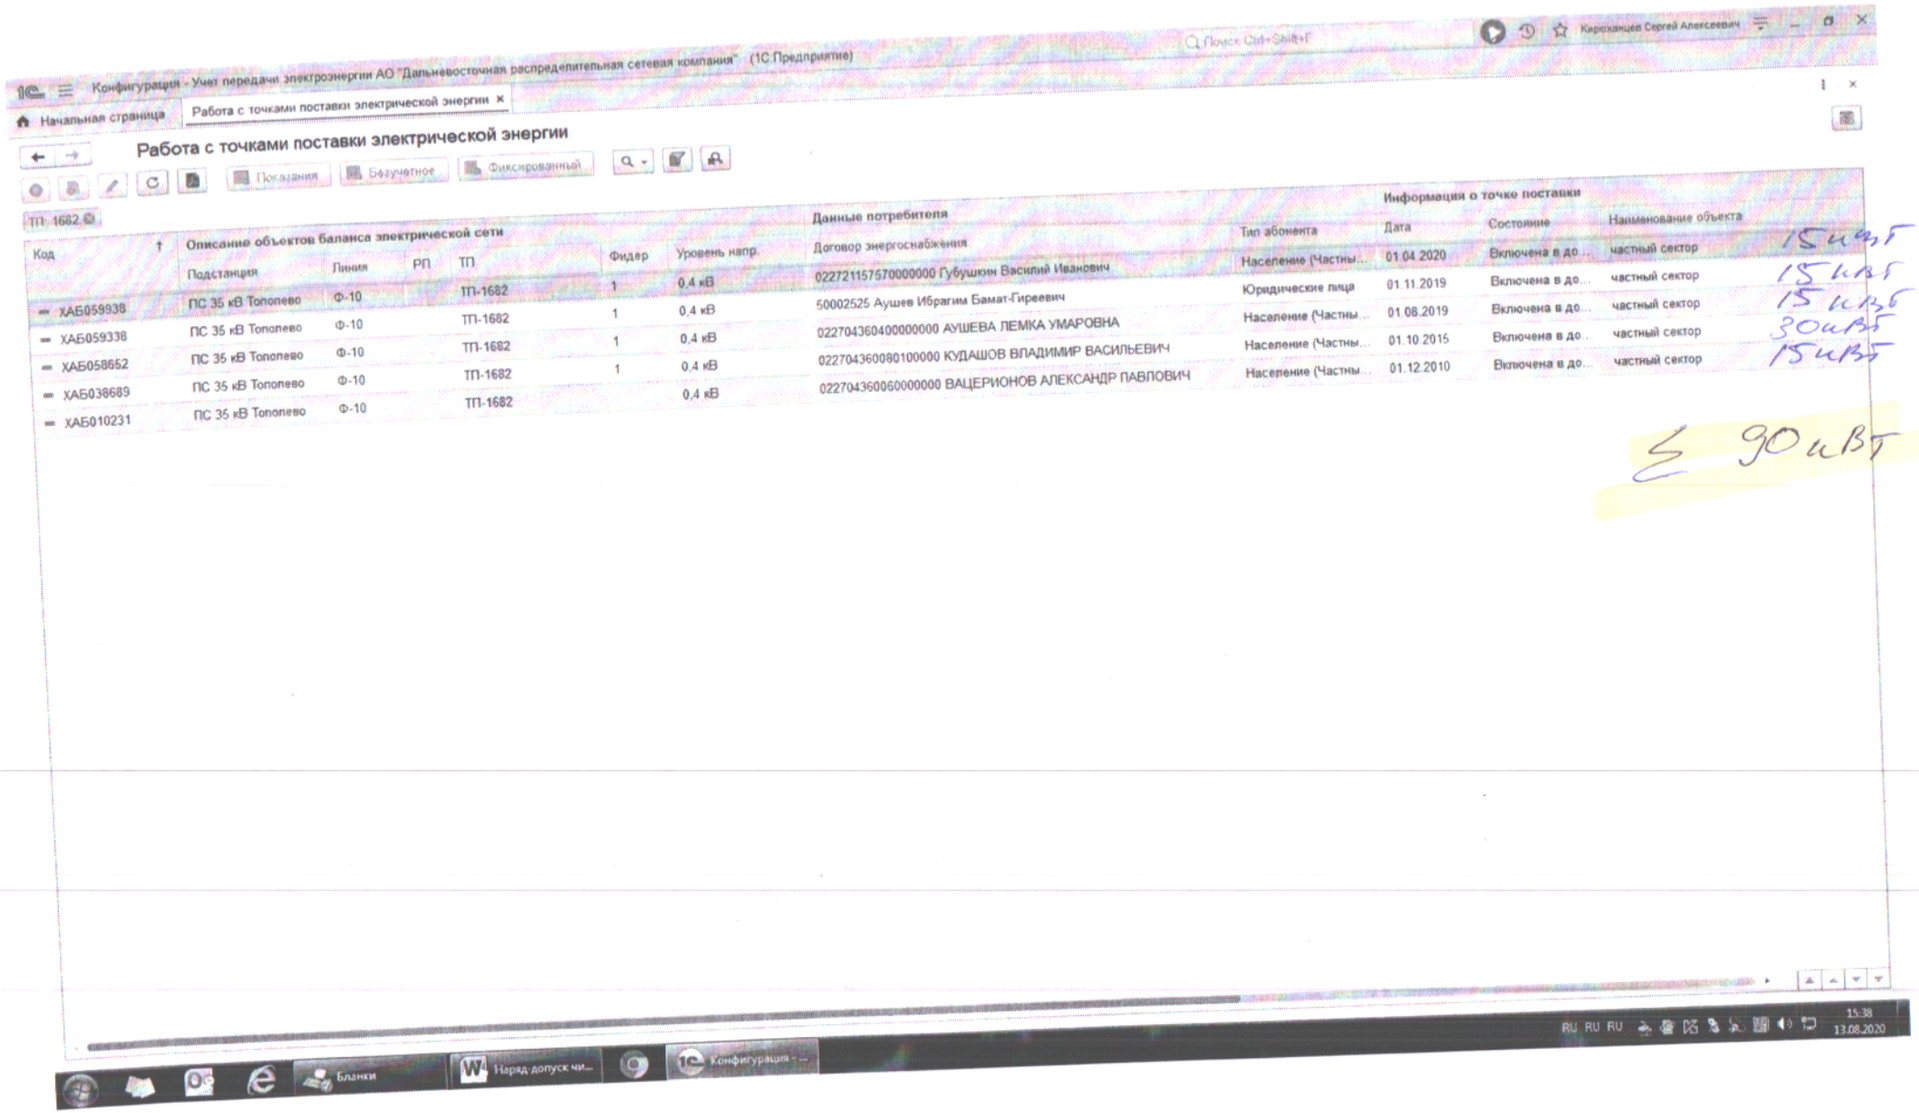
11. Дополнительные сведения по монтажу (заполняется при условии получения заявки на выполнение работ по технологическому присоединению «под ключ»):	
Высота приемной траверсы	
Высота трубостойки	
Марка счетчика ЭЭ с учетом информации указанной заявителем	
Уточненные данные по расстоянию от точки присоединения до планируемого места установки ВРУ 0,4 (0,22) кВ, м	

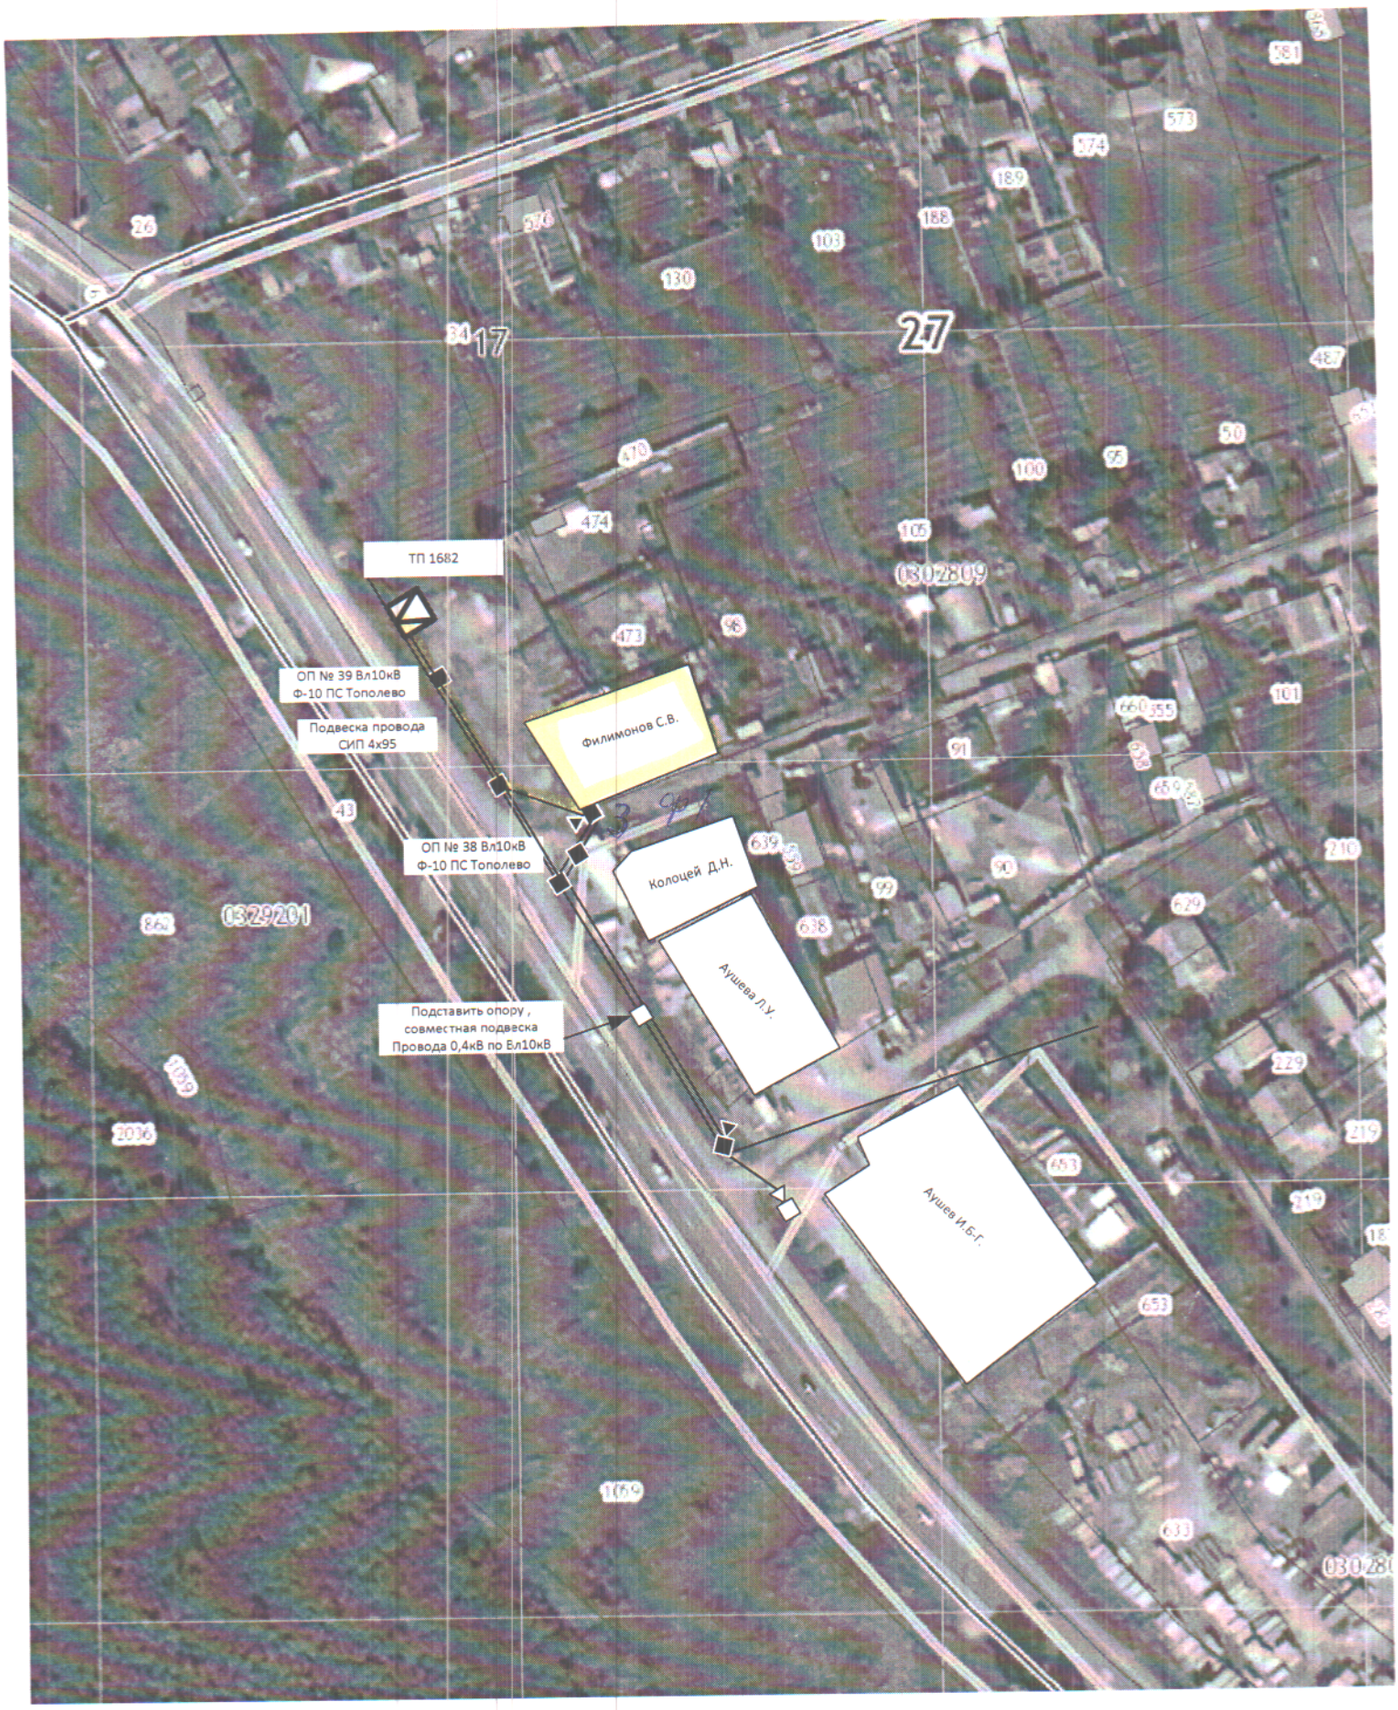
12. Примечания: Подвеска провода по существующим опорам. К Существующей ТП подключено 5 абонентов суммарной мощностью 90 кВт, требуется замена трансформатора.

13. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

Начальник ХСРЭС КАБАЕВ П.М.		Абраменко
Должность	Подпись	ФИО

«17» 08 2020 г.


Конфигурация - Учет передачи электроэнергии АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (1С:Предприятие)
Поиск Ctrl+Shift+F
Кирюханцев Сергей Алексеевич
Начальная страница
Работа с точками поставки электрической энергии
Работа с точками поставки электрической энергии
Показания
Безучетное
Фиксированный
ТП: 1682
Код
Описание объектов баланса электрической сети
Подстанция
Линия
РП
ТП
Фидер
Уровень напр.
Данные потребителя
Договор энергоснабжения
Тип абонента
Информация о точке поставки
Дата
Состояние
Наименование объекта
ХАБ059938
ПС 35 кВ Тополево
Ф-10
ТП-1682
1
0,4 кВ
02272115757000000 Губушкин Василий Иванович
Население (Частны...
01.04.2020
Включена в до...
частный сектор
ХАБ059338
ПС 35 кВ Тополево
Ф-10
ТП-1682
1
0,4 кВ
50002525 Аушев Ибрагим Бамат-Гиреевич
Юридические лица
01.11.2019
Включена в до...
частный сектор
ХАБ058652
ПС 35 кВ Тополево
Ф-10
ТП-1682
1
0,4 кВ
02270436040000000 АУШЕВА ЛЕМКА УМАРОВНА
Население (Частны...
01.08.2019
Включена в до...
частный сектор
ХАБ038689
ПС 35 кВ Тополево
Ф-10
ТП-1682
1
0,4 кВ
02270436008010000 КУДАШОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
Население (Частны...
01.10.2015
Включена в до...
частный сектор
ХАБ010231
ПС 35 кВ Тополево
Ф-10
ТП-1682
0,4 кВ
02270436006000000 ВАЦЕРИОНОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
Население (Частны...
01.12.2010
Включена в до...
частный сектор
15 кВт
15 кВт
15 кВт
30 кВт
15 кВт
≤ 90 кВт
Бланки
Наряд-допуск чи...
Конфигурация - ...
RU RU RU
15:38
13.08.2020


ТП 1682
ОП № 39 Вл10кВ
Ф-10 ПС Тополево
Подвеска провода
СИП 4х95
ОП № 38 Вл10кВ
Ф-10 ПС Тополево
Подставить опору ,
совместная подвеска
Провода 0,4кВ по Вл10кВ
Филимонов С.В.
Колоцей Д.Н.
Аушева Л.У.
Аушев И.Б.-Г.
27
0329201
0302809
