Начальнику СПРиТП _____

от начальника сетевого района II г. Вяземского РЭС Ашурова А.С.

Дата 05.08.2020 г. (*поручения о подготовке акта обследования*)

Акт обследования № ТПр 2104/20

Регистрационный номер ДОУ ТПр 2104/20 дата регистрации ДОУ 03.08.2020

1. Заявитель: Фаев Виктор Владимирович телефон: 914-545-50-43

2. Наименование объекта: квартира

Фактический объект: квартира

3. Адрес объекта: Хабаровский край, Вяземский р-н, с. Отрадное, ул. Школьная, д. 45-2

4. Заявленная мощность (кВт): 10

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 5

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-**Вяземская**, №ф. 6(10) кВ **« 19 »**, ТП № 930,

ТМ 6-10/0,4 400 кВА; № ф. 0,4 кВ **2**, № опоры 18.


9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 290 **метров.**

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения		Тип, параметры	Количество
1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ				
1.1.	Длина ЛЭП по трассе (м)		ВЛ	
			КЛ	
1.2.	Установка опор (шт.)	ж/б	одностоечная	
		деревянные	одностоечная с 1 укосом	
		на ж/б приставке	одностоечная с 2 укосами	
			1 укос	
1.3.	Подвеска провода по трассе, в три провода (м)			
1.4.	Установка разъединителей (1 компл.)			
1.5.	Установка реклоузера (1 компл.)			
1.6.	Муфта для КЛ (шт.)			
1.7.	Установка разрядников (ОПН) (шт.)			
2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ				
2.1.	Длина ЛЭП, по трассе (м)		ВЛ	670
			КЛ	
2.2.	Установка опор (шт.)	ж/б	одностоечная	
		деревянные	одностоечная с 1 укосом	
		н ж/б приставке	одностоечная с 2 укосами	
			1 укос	
2.3.	Подвеска провода по трассе ВЛ (м)	кол. проводов ВЛ	СИП 3х50 + 1х54,6	670
		2 провода		
		4 провода		
2.4.	Муфта для КЛ (шт.)			
2.5.	Устройство ответвления к зданию (шт.)		в 2 провода	
			в 4 провода	
3. Установка ТП				
3.1.	Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.)			
3.2.	Установка силового трансформатора в ТП			
4. Установка дополнительного оборудования				
4.1.	Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.)			
5. Демонтажные работы				
5.1.	Демонтаж опор		одностоечная	

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения		Тип, параметры	Количе
	ВЛ 10 кВ (шт.)	ж/б	одностоечная с 1 укосом	
			одностоечная с 2 укосами	
		деревянные	1 укос	
		на ж/б приставке		
5.2.	Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ (шт.)	ж/б	одностоечная	
			одностоечная с 1 укосом	
		деревянные	одностоечная с 2 укосами	
		на ж/б приставке	1 укос	
5.3.	Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ (пролетов)			19
5.4.	Демонтаж проводов ВЛ 6(10) кВ (пролетов)			
5.5.	Демонтаж ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП)			
5.6.	Демонтаж силового трансформатора в ТП			
5.7.	Демонтаж коммутационного аппарата в ТП (шт.)			
5.8.	Демонтаж ответвления к зданию (шт.)		в 2 провода	
			в 4 провода	
6. Работы на ПС 35-110 кВ				

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

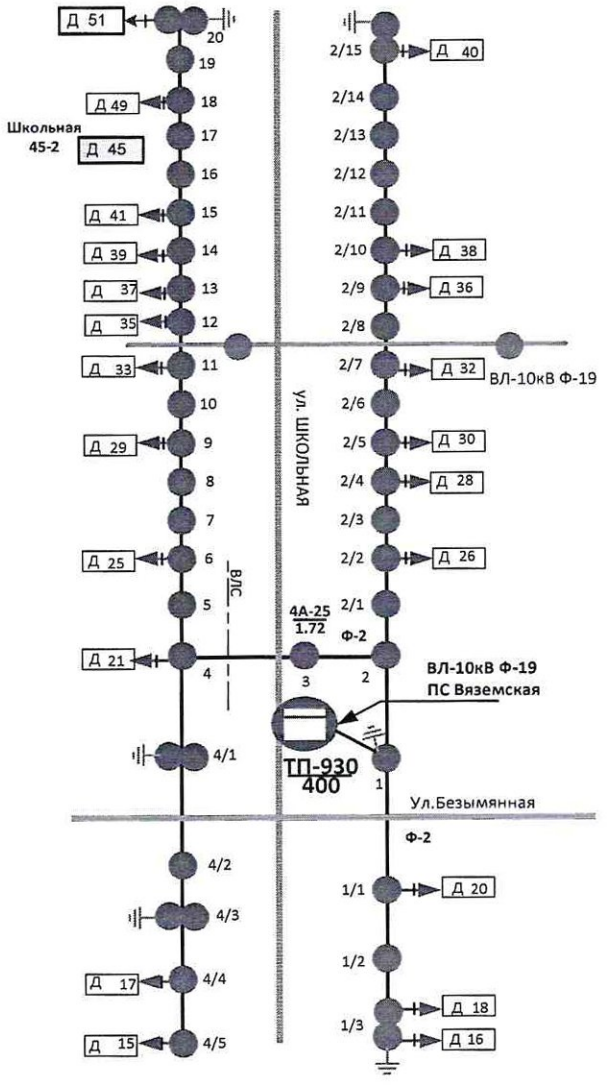

12. Примечания: замена неизолированного провода на СИП от оп.1 до оп.20 (670м)
Демонтаж: 10 пролетов А-25 (в 4 провода) 300м х 4=1200м; 6 пролетов А-25 (в три провода) 130м х 3 = 390м; 3 пролета А-25 (в два провода) 240 м х 2 = 480м. Подрезка крон деревьев – 15 шт.

Начальник ВРЭС — Должность

Подпись

Ашуров А.С — ФИО
