ОПРОСНЫЙ ЛИСТ-ЗАЯВКА
на поставку выключателей трёхполюсных элегазовых серии ВГБ-35

1. Количество заказываемых выключателей, шт. | 1 |
2. Исполнение выключателя по номинальному току Iном., А | 630 |
3. Исполнение выключателя по типу привода *(нужное отметить)*

Тип привода	Наименование параметра	Требуемые параметры		
		Стандартная поставка		По заказу
Привод ПЭМ-3 ☒	Номинальное напряжение переменного тока цепей питания электромагнитов включения, отключения и контактора, В	~ 220 ☒		—
	Электромагнит релейного отключения YAV на напряжение, В	= 220 ☒	~ 220 ☐	= 110 ☐
	Токовые электромагниты YAA на ток, А	5 ☒		3 ☐

4. Исполнение в зависимости от расстояния между приводом и выключателем *(нужное отметить)*

исполнение	размер Б, мм	размер В, мм	размер С, мм
стандартное ☒	850	2540	260

5. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ1 (+40 °С ÷ -60 °С) ☒ |
6. Исполнение по токовому выводу | стандартное (вариант 1) ☒ |
7. Исполнение выключателя по типу трансформаторного тока *(нужное отметить)*

стандартное исполнение со вторичным током 5 А	☒

Трансформатор тока	$I_{1ном.}/I_{2ном.}$, А	Класс точности/ нагрузка, ВА	Кбез. или Ккрат.	$I_{1ном.}/I_{2ном.}$, А	Класс точности/ нагрузка, ВА	Кбез. или Ккрат.	$I_{1ном.}/I_{2ном.}$, А	Класс точности/ нагрузка, ВА	Кбез. или Ккрат.	$I_{1ном.}/I_{2ном.}$, А	Класс точности/ нагрузка, ВА	Кбез. или Ккрат.
ТА1	**600/5**	0,2S/25	5	**300/5**	0,5S/15	5	**200/5**	0,5/10	5	**150/5**	0,5/5	5
ТА2	**600/5**	0,2S/25	5	**300/5**	0,5S/15	5	**200/5**	0,5/10	5	**150/5**	0,5/5	5
ТА3	**600/5**	10P/30	14	**300/5**	10P/15	10	**200/5**	10P/10	10	**150/5**	10P/10	10
ТА4	**600/5**	10P/30	14	**300/5**	10P/15	10	**200/5**	10P/10	10	**150/5**	10P/10	10
ТА5	**600/5**	10P/30	14	**300/5**	10P/15	10	**200/5**	10P/10	10	**150/5**	10P/10	10
ТА6	**600/5**	10P/30	14	**300/5**	10P/15	10	**200/5**	10P/10	10	**150/5**	10P/10	10

8. Дополнительные требования заказчика

8.1. Герметизировать выход кабелей токовых цепей из клеммных коробок трансформаторов тока.


8.2. Исполнение изоляции вводов – фарфор.

8.3. Дополнительно включить в состав поставки электромагнит релейного отключения YAV на переменное напряжение 220 В.


8.4. Дополнительно включить в состав поставки токовые электромагниты YAV на ток 3 А.

Главный специалист сектора РЗАИ
филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» ***А.Ю. Смирных***

Начальник ПТС
филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» ***Д.В. Матющенко***

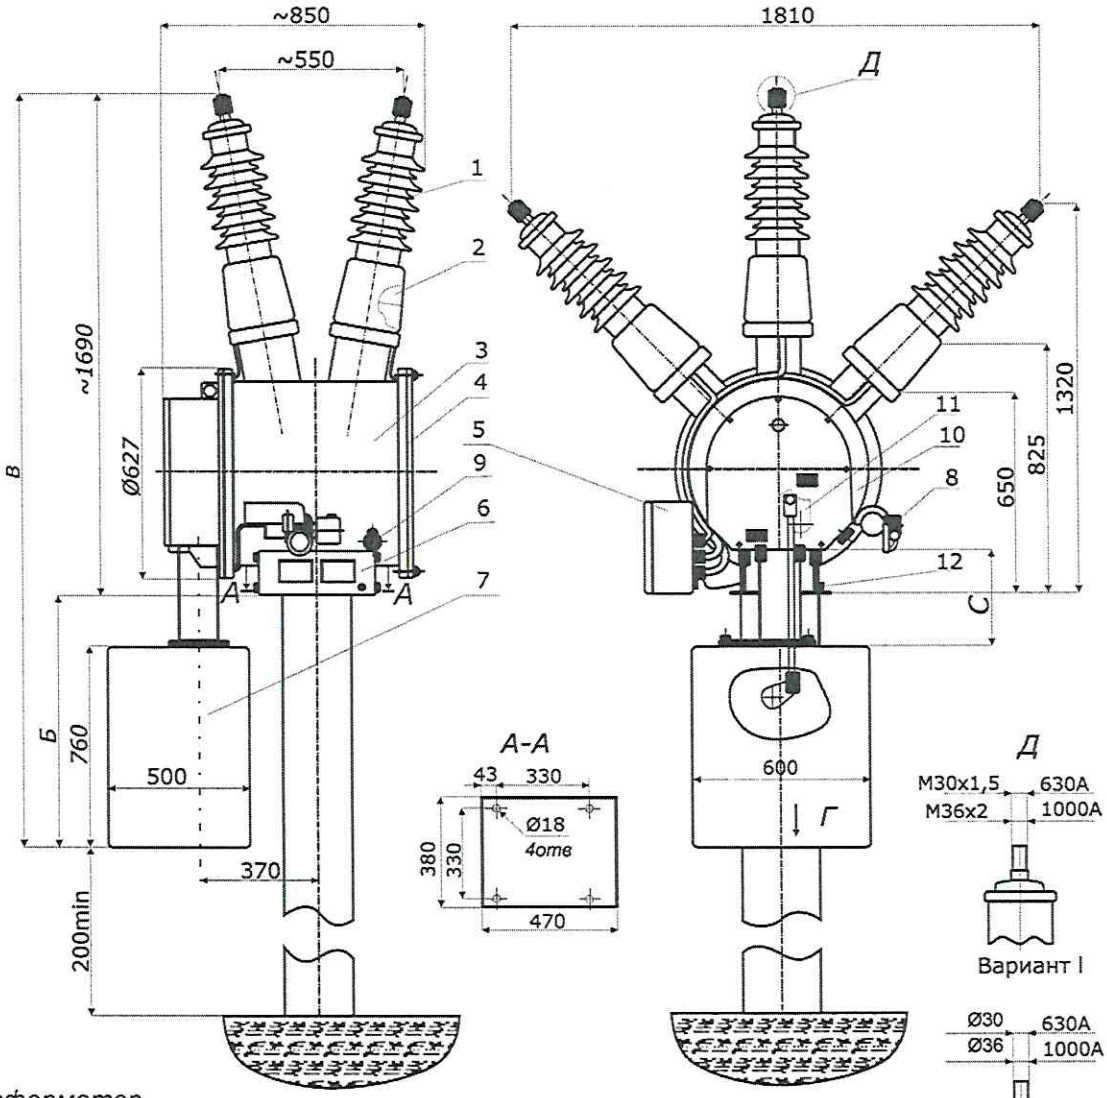


Трансформатор



На каждом вводе установлены конструктивно одинаковые трансформаторы тока

Г

Привязка отверстий под кабельные вводы



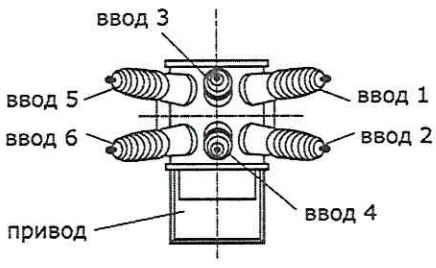


Схема расположения вводов

1- ввод; 2- трансформатор тока; 3- бак; 4- фланец; 5- шкаф (в днище имеются 7 отв Ø 25,6 и 1 отв Ø20,8 для установки кабельных вводов); 6- устройство подогревательное; 7- шкаф с приводом; 8- сигнализатор плотности; 9- клапан; 10- крышка; 11- механизм; 12- болт заземления.

Значения размеров Б, В и С указаны в табл.3 "Опросного листа"
