Дата 19.08.2020г. (*поручения о подготовке акта обследования*)

Дата _ г. (*направления заполненного акта обследования*)

Акт обследования № ТПр 3234/20

Регистрационный номер ДОУ ТПр 3234/20 дата регистрации ДОУ 19.08.2020

1. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "ДНС ДОМ" телефон: 890206060783

2. Наименование группа жилых кварталов и объектов социального назначения ТП-6/0,4 кВ 2х1000 кВА

3. Адрес объекта: Приморский край, Надеждинский р-н, п. Зима Южная, в 247 м на северо-запад от жилого дома по ул.Озерная, д. 8, кадастровый номер земельного участка 25:10:270001:776

4. Заявленная мощность (кВт): 850

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 6 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 2.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

1 этап:

Первая точка присоединения: ближайшая опора проектируемой ЛЭП 6 кВ от ЛЭП 6 кВ фид. 6 кВ №29 ПС 110/6 кВ Де-Фриз.


Вторая точка присоединения: ближайшая опора проектируемой ЛЭП 6 кВ от ЛЭП 6 кВ фид. 6 кВ №20 ПС 35/6 кВ Надеждинская.

Расстояние по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: ___20_____ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения		Тип, параметры	Количество
1. Строительство ЛЭП 6 кВ от Ф-29 ПС 110/6 кВ Де-Фриз и Ф-20 ПС 35/6 КВ Надеждинская				
1.1.	Длина ЛЭП по трассе (м)		ВЛ	40
			КЛ	
1.2.	Установка опор (шт.)	ж/б	одностоечная	
		деревянные	одностоечная с 1 укосом	2
		на ж/б приставке	одностоечная с 2 укосами	
			1 укос	2
1.3.	Подвеска провода по трассе, в три провода (м)		СИП 3 1х50 В т.ч ошиновка РЛНД	35 5
1.4.	Установка разъединителей (1 компл.)		РЛНД 6/200	2

13. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

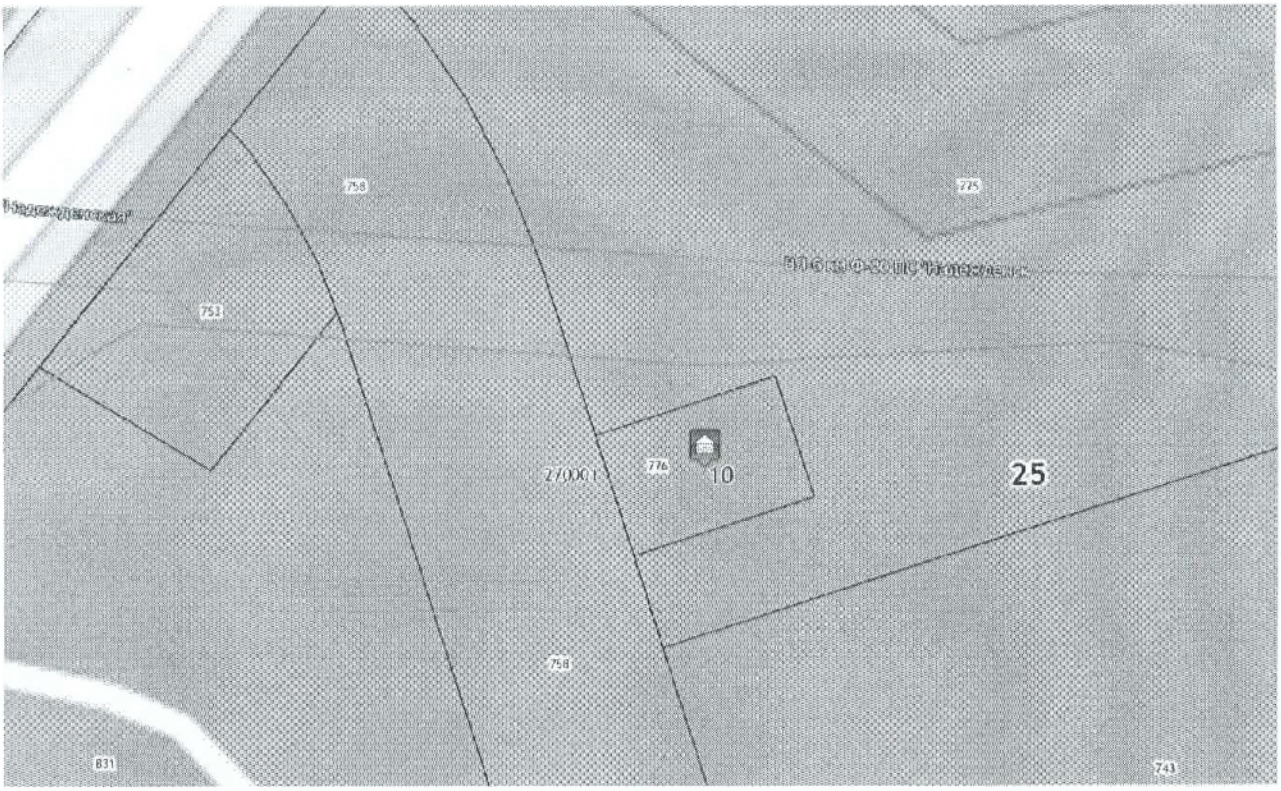

12. Примечания: Для подключения заявителя требуется строительство двухцепной ВЛ 6кВт проводом СИП3 1х50 протяженностью 20 м от ВЛ 6 кВ фид. 6 кВ №29 Де-Фриз и фид. 6 кВ №20 ПС Надеждинская.

ТТ - собственные.
