СМР

Акт обследования № _____

Регистрационный номер ДОУ ТПр 8936/22 дата регистрации ДОУ 09.08.2022

1. Заявитель: Общество с ограниченной ответсвенностью "АКИРА ОИЛ" телефон: +7(924)231-03-72

2. Наименование объекта: складской комплекс с административными помещениями

Фактический объект: _____

3. Адрес объекта: Приморский край, г.Артем, ул. Рабочая 2-я, д. 142б., кадастровый номер земельного участка 25:27:030103:1048

4. Заявленная мощность (кВт): 150

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 6 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-**Западная,** №ф. 6 кВ **« Ф-28 »,** строительство КЛ 6кВ от сущ.опоры № 27/4 до границы участка заявителя


9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: _____23_____ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения		Тип, параметры	Количество
1. Строительство ВЛ и КЛ 6 кВ				
1.1.	Длина ЛЭП по трассе (м)		ВЛ	**30**
			КЛ в т.ч ГНБ	**450**
1.2.	Установка опор (шт.)	ж/б	одностоечная	
		деревянные	одностоечная с 1 укосом	2
		на ж/б приставке	одностоечная с 2 укосами	
			1 укос	1
1.3.	Подвеска провода по трассе, в три провода (м)		СИП3 1х50 В т.ч ошиновка РЛК ААБл 3х120 В т.ч. спуск и подъем по опоре В т.ч. заход в ПКУ	115 18 460 30 10
1.4.	Установка разъединителей (1 компл.)		РЛК	2
1.6.	Муфта для КЛ (шт.)		Концевые промежуточная	4 2
2.Строительство ЛЭП 6кВ (ГНБ)				
2.1.	Длина ЛЭП по трассе (м)		КЛ +1 резервная	**60**
	Прокладка кабеля ГНБ		ААБл 3х120	130
4. Установка дополнительного оборудования				

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения	Тип, параметры	Количество
4.1.	Установка коммерческого учета электрической энергии	ПКУ 6кВ	1
6. Работы на ПС 110 кВ Западная не требуются			
	Без мероприятий		

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой и сторонними объектами инженерной инфраструктуры):

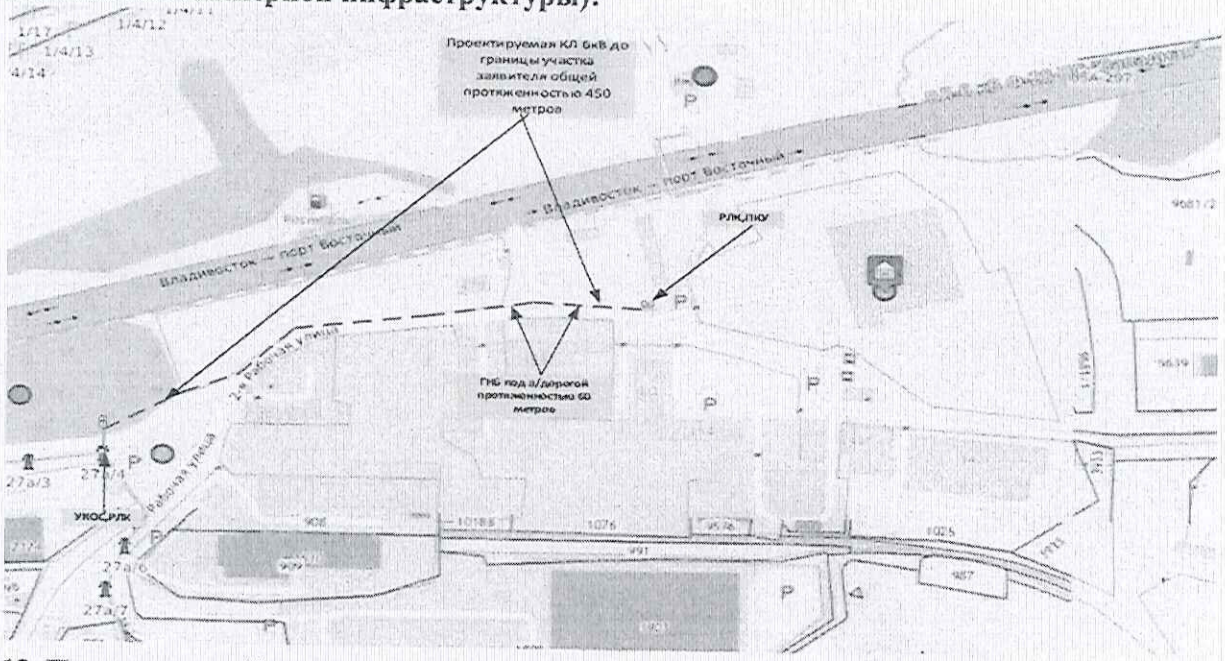

12. Примечания: Для подключения заявителей требуется строительство ЛЭП от точки подключения до границы участка заявителя. При проектировании и строительстве учесть, что участок заявителя находится в плотно застройке благоустроенных территорий с наличием коммуникаций, наличие автомобильной асфальтированной дороги.

На существующей опоре ВЛ6кВ №27/4 Ф-28 ПС Западная установить укос и разъединитель, при проектировании и строительстве ВЛ6кВ учесть переходе через автомобильную дорогу с интенсивным движением в стесненных условиях , смонтировать повышенную траверсу для перехода через дорогу, выполнить строительство ВЛ 6кВ протяженностью 30 метров проводом СИП3 1х50, далее перейти в строительство КЛ6кВ общей протяженностью 450 метров с переходом ГНБ протяженностью 60 метров под асфальтированным покрытием. На границах земельных участках заявителей установить ПКУ6кВ.
