Акт обследования № _____

Регистрационный номер ДОУ ТПр 9074/22 дата регистрации ДОУ 12.08.2022

1. Заявитель: Краевое государственное казенное учреждение"Управление капитального строительства Приморского края" телефон: 89147923291

2. Наименование объекта: Туристский кластер "Приморье" в бухте Муравьиная. Внеплощадочные и внутриплощадочные кольцевые сети водопровода. I этапа 2 очереди. Водоотведение 4 этап (КНС №5).

Фактический объект: _____

3. Адрес объекта: Приморский край, г. Артем, в 2750 м на северо-восток от бухта Муравьиная, 36, кадастровый номер земельного участка 25:27:000000:9330

4. Заявленная мощность (кВт): 30

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 6 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-Муравейка, РП 6кВ «Ф-23», ячейка №1 строительство отпайки КЛ6кВ , на контактах планируемой КЛ6кВ

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 100 **метров.**

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения			Тип, параметры	Количество
1. Строительство КЛЭП 6 кВ КНС№5					
1.1.	Длина ЛЭП по трассе (м)			КЛ	**850**
				КЛ (ГНБ)-3 шт.	**100**
1.2.	Установка опор (шт.)		ж/б	одностоечная	
			деревянные	одностоечная с 1 укосом	
			на ж/б приставке	одностоечная с 2 укосами	
				1 укос	
1.3.	Прокладка кабеля по трассе, в три провода (м)			ААБл 3х70 В т. ч. заход в ТП В т. ч. в РП В т. ч ГНБ-(3шт.)	1010 10 10 100
1.4.	Установка разъединителей (1 компл.)				
1.6.	Муфта для КЛ (шт.)			Муфта Концевая	2
4. Установка дополнительного оборудования					
4.1.	Установка коммерческого учёта в абонентское ТП (шт.)			Учёт 0,4кВ	1

Регистрационный номер ДОУ ТПр 9077/22 дата регистрации ДОУ 12.08.2022

1. Заявитель: Краевое государственное казенное учреждение"Управление капитального строительства Приморского края" телефон: 89147923291

2. Наименование объекта: Туристский кластер "Приморье" в бухте Муравьиная. Внеплощадочные и внутриплощадочные кольцевые сети водопровода I этапа 2 очереди. Водоотведение 4 этап. (КНС №4).

Фактический объект: _____

3. Адрес объекта: Приморский край, г. Артем, в 2860 м на северо-восток от побережье бухты Пионерской, д. 11

4. Заявленная мощность (кВт): 50

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 6 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-Муравейка, РП 6кВ «Ф-23», ячейка №14 строительство отпайки КЛ6кВ , на контактах планируемой КЛ6кВ

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 540 **метров.**

Регистрационный номер ДОУ ТПр 11808/22 дата регистрации ДОУ 28.11.2022

1. Заявитель: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края телефон: 89089646205

2. Наименование объекта: сети наружного освещения , сектор7

Фактический объект: _____

3. Адрес объекта: Приморский край, бухта Муравьиная, кадастровый номер земельного участка 25:27:020102:133

4. Заявленная мощность (кВт): 13,5

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-Муравейка, РП 6кВ «Ф-23», ячейка №14 строительство отпайки КЛ6кВ , строительство КТП-25кВА (номер присвоить после строительства), РУ0,4кВ.

0,4 кВ 350 (м)

6/10 кВ_150_(м)

Регистрационный номер ДОУ ТПр 11810/22 дата регистрации ДОУ 28.11.2022

1. Заявитель: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края телефон: 89089646205

2. Наименование объекта: наружное освещение автомобильной дороги объекта «Строительство объекта«Туристический кластер «Приморье» в бухте Муравьиная. Автомобильная¶дорога, 4 этап. Сектор 8»

Фактический объект: _____

3. Адрес объекта: Приморский край, г Артем, в 2860 м на северо-восток от дома побережье бухты Пионерской д.11, автомобильная дорога 4 этап ; учетный номер зем.уч-ка: 25:27:020102:133/67, кадастровый номер земельного участка 25:27:020102:133

4. Заявленная мощность (кВт): 11

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-Муравейка, РП 6кВ «Ф-23», ячейка №14 строительство отпайки КЛ6кВ , строительство КТП-40кВА (номер присвоить после строительства), РУ0,4кВ.


0,4 кВ 600 (м)


6/10 кВ 500 (м)

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения		Тип, параметры	Количество
1. Строительство КЛЭП 6 кВ КНС-№4				
1.1.	Длина ЛЭП по трассе (м)		КЛ	**1480**
			КЛ (ГНБ)-4 шт.	**100**
1.2.	Установка опор (шт.)	ж/б	одностоечная	
		деревянные	одностоечная с 1 укосом	
		на ж/б приставке	одностоечная с 2 укосами	
			1 укос	
1.3.	Прокладка кабеля по трассе, в три провода (м)		ААБл 3х70 В т. ч. заход в ТП (5шт.) В т. ч. в РП В т. ч. ГНБ (4 шт.)	1710 50 10 100
1.4.	Установка разъединителей (1 компл.)			
1.6.	Муфта для КЛ (шт.)		Муфта Концевая	6
3. Установка ТП				
3.1	Установка ТП 6/0,4 кВ (1 ТП с транс.)		КТП-40кВА Кабель\Кабель	1
4. Установка дополнительного оборудования				
4.1.	Установка коммерческого учёта в абонентское ТП (шт.)		Учёт 0,4кВ	1
4.2	Установка коммерческого учета электрической энергии в проектируемой ТП (шт.)		Счетчик электрической энергии 3-х фазный РиМ, РиМ 489.18.ВК3 (РиМ 489.08+ДД РиМ-040.03) с отключением нагрузки	2

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой и сторонними объектами инженерной инфраструктуры):

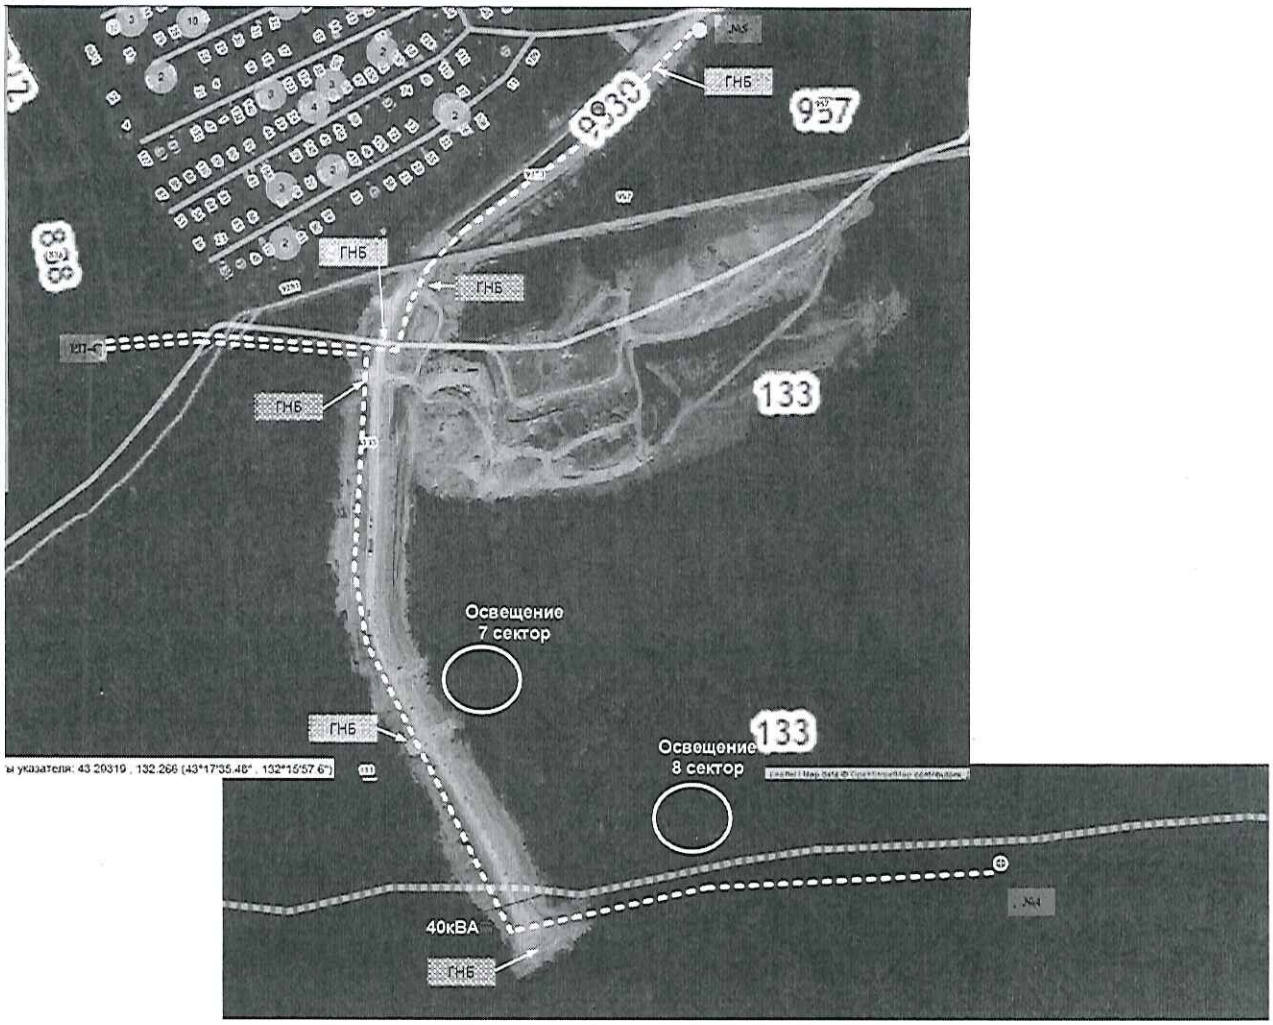

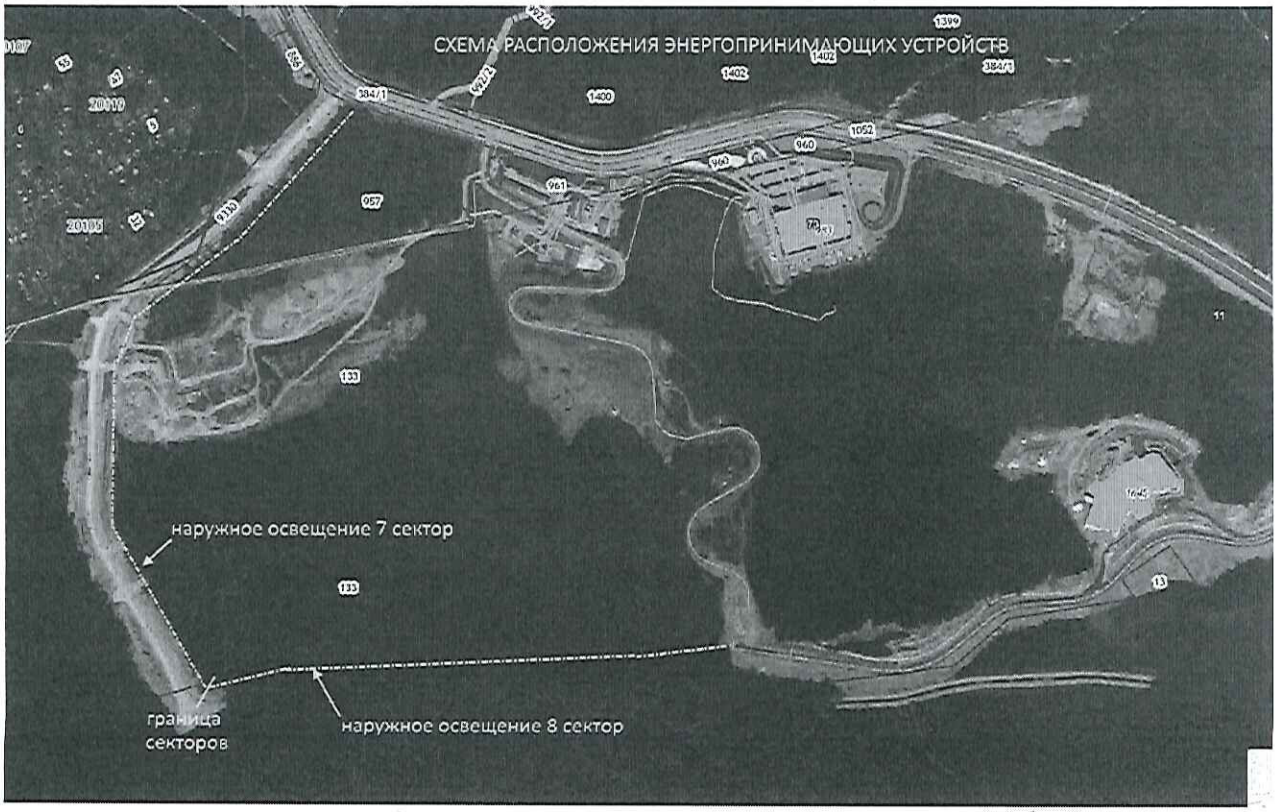

13. Примечания: Для подключения объектов КНС-4 и КНС-5 необходимо произвести прокладку 2-х кабельных линий 6кВ от РП-4 ПС Муравейка, по КНС-5 осуществить 3 прокола ГНБ под дорогой , строительство кабельной линии ориентировочно общей протяженностью 850 метров, по КНС-4 осуществить 4 прокола ГНБ под дорогой , позже так же поданы 2 заявления на подключение освещения автодороги по 0,4кВ в сторону КНС-4 (требуется установить дополнительно для сектора №7 и сектора №8 проходную КТП-40кВА для освещения дороги с кабельным вводом, общая протяженность с ГНБ(3 шт.-75м) кабельной линии 6кВ 925 метров, установка коммерческого учёта в ТП - 2шт.) , строительство общей кабельной линии ориентировочно общей протяженностью 1480 метров для сектора №7-№8 и КНС4. Так как строительство дороги и отсыпка, прокладка подземных коммуникаций ещё не завершена, при строительстве кабельной линии 6кВ требуется проектирование и согласование , а так же восстановление газонов и пешеходных тротуаров после СМР. Так же возможно прохождение КЛ-6кВ через ручей (выполнить в металлической трубе, сечение и длину уточнить при проектировании). Отправить на проект.
