Дата 27.01.2021 г. (*поручения о подготовке акта обследования*)

Дата _____ (*направления заполненного акта обследования*)

Акт обследования № ТПр 3899/20

Регистрационный номер ДОУ ТПр 3899/20 дата регистрации ДОУ 23.09.2020

1. Заявитель: Истерн Аква Парадайз ООО. **телефон: 89025240404, 89084505021**

2. Наименование объекта: "Реакционно-спортивный комплекс с аквапарком, многофункциональный семейный центр "Аквапарадайз"

3. Адрес объекта: Приморский край, г. Владивосток, нп. Русский Остров, в 650 м на юго-запад от нежилого здания по ул.Академика Касьянова, д. 25, кадастровый номер земельного участка 25:28:060109:530

4. Заявленная мощность (кВт): 3 400

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 10 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 2

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: Элементы электрической сети сетевой организации, расположенные в РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ от проектируемой ЛЭП 10 кВ от линейной ячейки 10 кВ № 6 ПС 35/10 кВ Океанариум.


Вторая точка присоединения: Элементы электрической сети сетевой организации, расположенные в РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ от проектируемой ЛЭП 10 кВ от линейной ячейки 10 кВ № 19 ПС 35/10 кВ Океанариум.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 20 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения	Тип, параметры	Количество
Первая точка. 1.Строительство ЛЭП 10 кВ			
1.1.	Длина ЛЭП по трассе (м)	ВЛ	
		КЛ АПвПуг 3х240	**2х600**
2. Работа на ПС 35/10 кВ Океанариум			
3.1.	Монтаж трансформаторов тока	ТТ 400/5	6

12. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

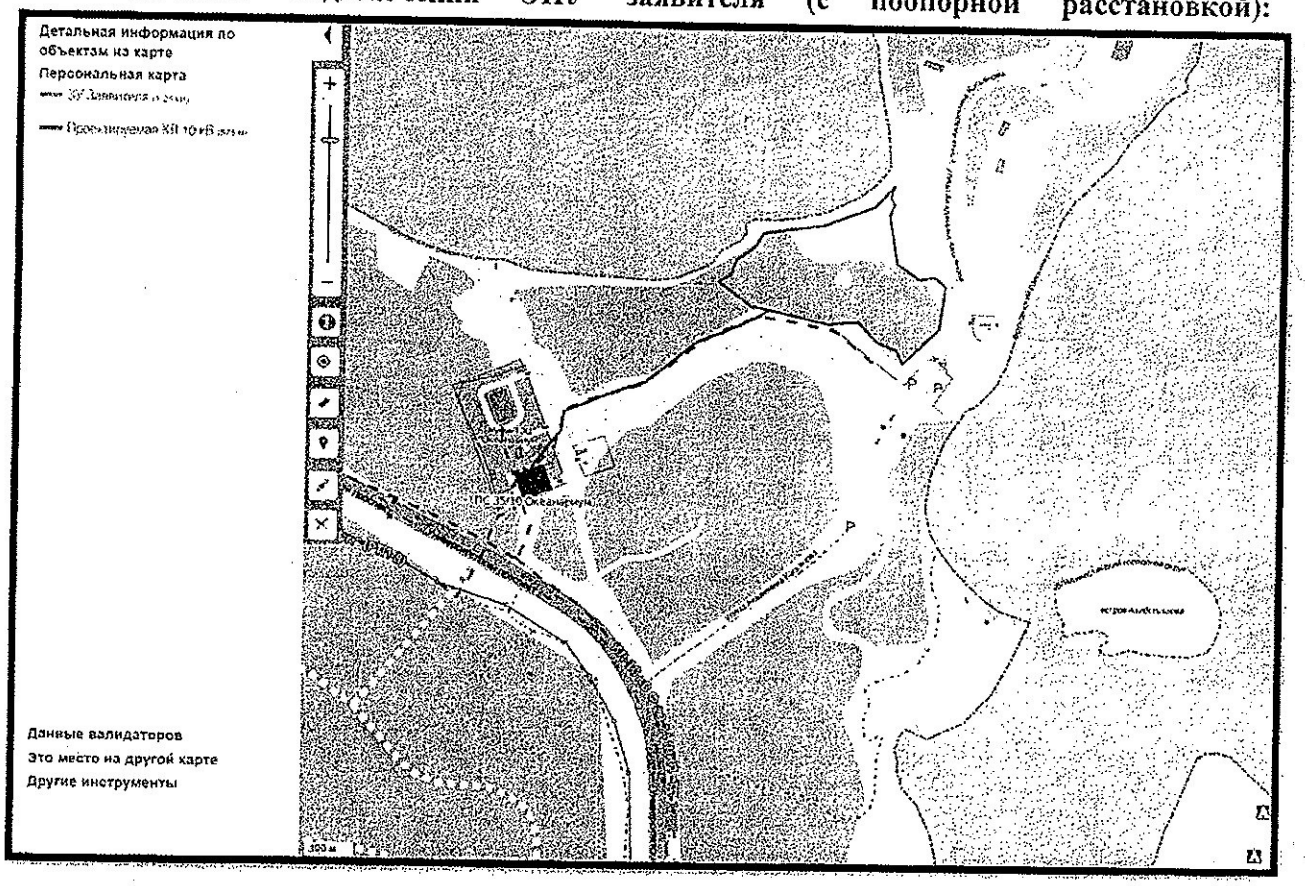

12. Примечания: Для подключения заявителя необходимо осуществить замену трансформаторов тока в линейных ячейках №6 и №19 ПС 35/10 кВ Океанариум и строительство КЛ 10 кВ до границы земельного участка заявителя.
