Акт обследования № _____

1. Заявитель: Филиал ОАО «РЖД» Дальневосточная дирекция по капитальному строительству.

2. Наименование объекта:

Фактический объект: ВЛ-6 кВ Ф-10 «Депо», инв. № PR0028028

3. Адрес объекта: Приморский край, с. Смоляниново, ул. Маяковского

4. Заявленная мощность (кВт):

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 6 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3):

7. Ранее присоединённая мощность (кВт):

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС- **Депо**, №Ф 6 кВ **« 10 »,**


9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: _____ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения			Тип, параметры	Количество
1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ					
1.1.	Длина ЛЭП по трассе (м)			ВЛ	
				КЛ 3х95	320
1.2.	Установка опор (шт.)	*	ж/б	одностоечная	
				одностоечная с 1 укосом	
			деревянные	одностоечная с 2 укосами	
			на ж/б приставке	1 укос	2
1.3.	Подвеска провода по трассе, в три провода (м)				
1.4.	Установка разъединителей (1 компл.)				
1.5.	Установка реклоузера (1 компл.)				
1.6.	Муфта для КЛ (шт.)			КВТп 10 70х120	2
				КНТп 10 70х120	2
1.7.	Установка разрядников (ОПН) (шт.)				
2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ					
2.1.	Длина ЛЭП, по трассе (м)			ВЛ	
				КЛ	
2.2.	Установка опор (шт.)		ж/б	одностоечная	
				одностоечная с 1 укосом	
			деревянные	одностоечная с 2 укосами	
			на ж/б приставке	1 укос	
2.3.	Подвеска провода по трассе ВЛ (м)	кол. проводов ВЛ			
			2 провода		
			4 провода		

№ пп	Наименование работ и затрат, единица	Тип, параметры	Колич
2.5.	Устройство ответвления к зданию	в 2 провода	
		в 4 провода	
3. Установка ТП			
3.1.	Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.)		
3.2.	Установка силового трансформатора в ТП		
4. Установка дополнительного оборудования			
4.1.	Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.)		
5. Демонтажные работы			
5.1.	Демонтаж опор ВЛ 6 кВ (шт.)	одностоечная	
	ж/б	одностоечная с 1 укосом	1
	деревянные	одностоечная с 2 укосами	
*	на ж/б приставке	1 укос	
	Демонтаж КЛ 6 кВ, м		130
	Демонтаж ВЛ 6 кВ, м		150
5.2.	Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ (шт.)	одностоечная	
	ж/б	одностоечная с 1 укосом	
	деревянные	одностоечная с 2 укосами	
	на ж/б приставке	1 укос	
5.3.	Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ, м		
5.4.	Демонтаж проводов ВЛ 6(10) кВ, м		
5.5.	Демонтаж ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП)		
5.6.	Демонтаж силового трансформатора в ТП		
5.7.	Демонтаж коммутационного аппарата в ТП (шт.)		
5.8.	Демонтаж ответвления к зданию (шт.)	в 2 провода	
		в 4 провода	
6. Работы на ПС 35-110 кВ			

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

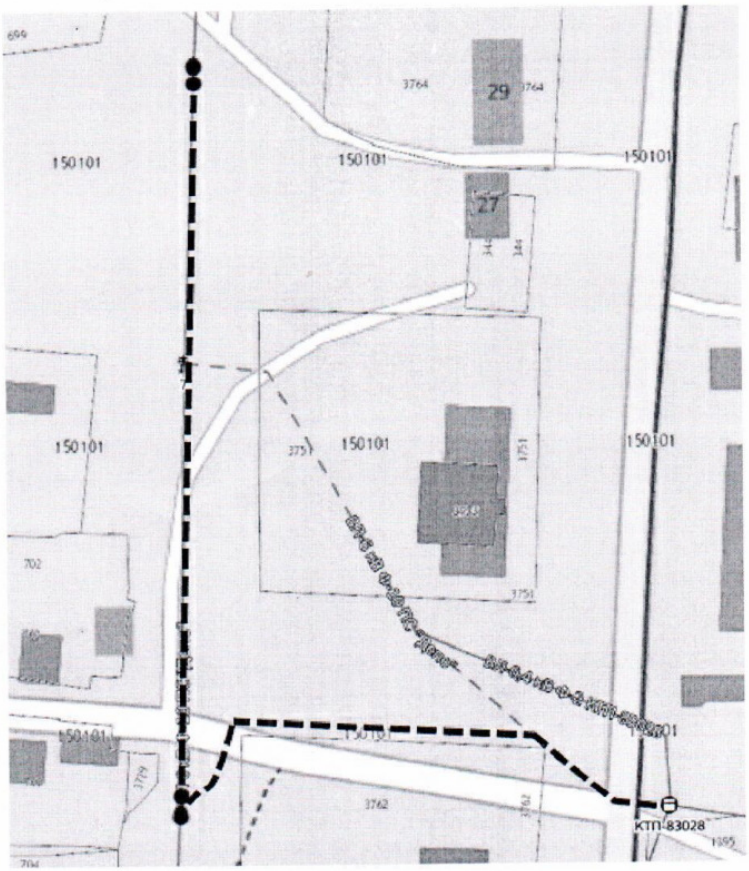

Примечание: Под дорогой предусмотреть укладку в полиэтиленовой трубе. Предусмотреть установку РЛНД на оп.6.
