И.о. начальника СТП
А.В. Николаеву
от начальника Благовещенского РЭС
Филимонова В.А.

Дата поручения о подготовке акта обследования: 07.08.2020
Дата направления заполненного акта обследования: 07.08.2020

Акт обследования

1. Заявитель: Плигин Владислав Григорьевич телефон: 89244429888

2. Наименование объекта: дачный дом

3. Адрес объекта: Амурская область, Благовещенский район, 7 км. Игнатьевского шоссе, с/т «Управления Ф.С.К.Р.Ф.»

Кадастровый или условный № 28:10:130293:6

4. Заявленная мощность (кВт): 15

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3

7. Ранее присоединённая мощность, категория надёжности и уровень напряжения:
Новое строительство

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети ОАО «ДРСК»:
Первая точка присоединения: ПС – **Кооперативная** №ф. 6(10) кВ «**10**», ТП № **проектируемая** № ф. 0,4 кВ__,№ опоры ___.

Вторая точка присоединения: ПС-_____, №ф. 6(10) кВ «_____», ТП № _____, № ф. 0,4 кВ, _____ . № опоры _____.


9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 451 метр.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения			Тип, параметры	Количество
1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ					
1.1.	Длина ЛЭП по трассе (м)			ВЛ	**4300**
				КЛ	
1.2.	Установка опор (шт.)		ж/б	одностоечная	
			деревянные	одностоечная с 1 укосом	
			на ж/б приставке	одностоечная с 2 укосами	
				1 укос	
1.3.	Подвеска провода, в три провода (м)				
1.4.	Установка разъединителей (1 компл.)				
1.5.	Установка реклоузера (1 компл.)				
1.6.	Муфта для КЛ (шт.)				
1.7.	Установка разрядников (шт.)				
2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ					
2.1.	Длина ЛЭП, по трассе (м)			ВЛ	**100**
				КЛ	
2.2.	Установка опор (шт.)	X	ж/б	одностоечная	
			деревянные	одностоечная с 1 укосом	
			на ж/б приставке	одностоечная с 2 укосами	
				1 укос	
2.3.	Подвеска провода, по длине ВЛ (м)	кол. Проводов ВЛ		Марка провода	
			2 провода	**СИП2А 3х70+1х70**	
		X	4 провода		**110**
2.4.	Муфта для КЛ (шт.)				
2.5.	Устройство ответвления к зданию (шт.)			в 2 провода	
				в 4 провода	**X**

3. Установка ТП				
3.1.	Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП)		**Установка ТП 6(10)/0,4 кВ**	**1**
3.2.				
4. Установка дополнительного оборудования				
4.1.	Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.)			
5. Демонтажные работы				
5.1.	Демонтаж опор ВЛ 10 кВ (шт.)	ж/б	одностоечная	
		деревянные	одностоечная с 1 укосом	
		на ж/б приставке	одностоечная с 2 укосами	
			1 укос	
5.2.	Демонтаж опор ВЛ 0,38 кВ (шт.)	ж/б	одностоечная	
		деревянные	одностоечная с 1 укосом	
		на ж/б приставке	одностоечная с 2 укосами	
			1 укос	
5.3.	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ (пролетов)			
5.4.	Демонтаж проводов ВЛ 6(10) кВ (пролетов)			
5.5.	Демонтаж ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП)			
5.6.	Демонтаж силового трансформатора в ТП			
5.7.	Демонтаж коммутационного аппарата в ТП (шт.)			
5.8.	Демонтаж ответвления к зданию (шт.)		в 2 провода	
			в 4 провода	
6. Работы на ПС 35-110 кВ				

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

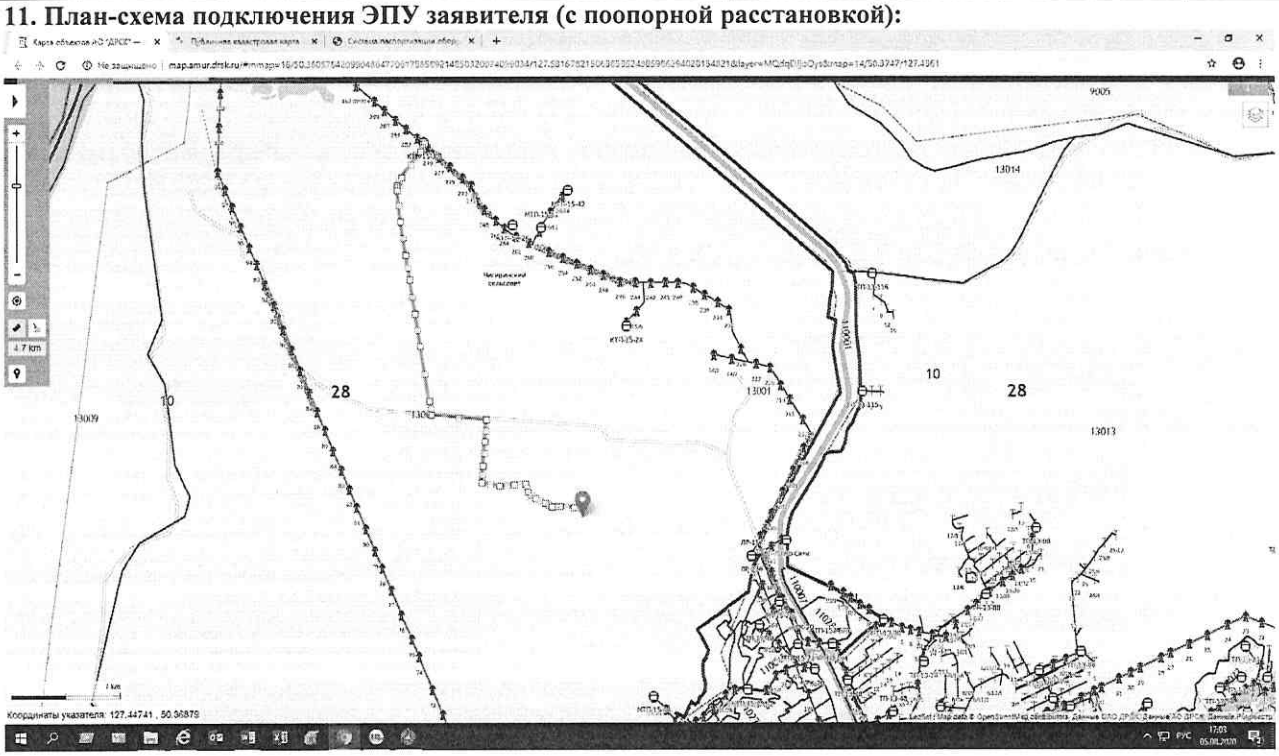

12. Примечания: необходимо выполнить проект электроснабжения: строительство ВЛ 10-0,4 кВ с установкой ТП 10/0,4кВ. Трассу прохождения ВЛ 10-0,4 кВ, марку провода, тип и мощность ТП определить проектом. Точкой подключения проектируемой ВЛ 10 кВ принять проектируемый Ф-10 кВ № 10 ПС «Кооперативная». Электроснабжение объекта выполнить от проектируемой ВЛИ-0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ.

Совместить с заявкой Булаткин А.В. (договор заключается).

Начальник БРЭС — Филимонов В.А.

Должность — Подпись — ФИО

«07» августа 2020 г.
